

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 1: MODULO B Vista con integrantes de la junta escolar y Personal docente.



Foto 2: MODULO A Vista de parales de madera para entarimar las vigas que fueron fundidas con esperas para poder anclar tensiones y bastones de la losa.



Foto 3: MODULO A Vista colocacion de paraleado para poder ensamblar la obra falsa que servirá para colocar el emparrillado de la losa.



Foto 4: MODULO A Vista colocacion de paraleado para poder ensamblar la obra falsa que servirá para colocar el emparrillado de la losa.



Foto 5: MODULO A Vista de parales de madera para entarimar las vigas que fueron fundidas con esperas para poder anclar tensiones y bastones de la losa.

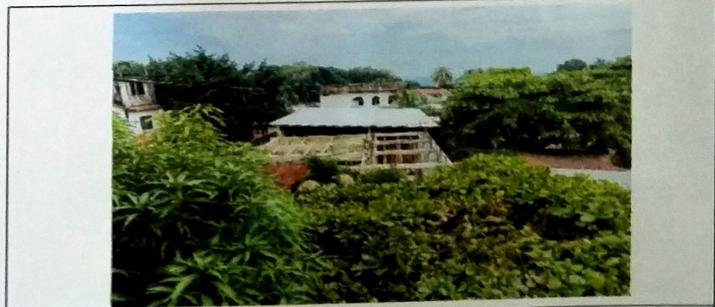


Foto 6: MODULO A Vista exterior panoramica donde se observa el area que se esta trabajando el armado de losa y el area que fue ya cubierta con lamina troquelada cal 26.

Ruth Masinel Lopez B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arquitecto Erick Estuardo Enriquez Méndez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	TAXISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE LINDORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0262-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/07/2024



Foto 7: MODULO A Vista de AULA donde fue sustituida la cubierta de asbesto y colcoada la estructura de metal con lamina troquelada cal 26.



Foto 8:MODULO A Vista de AULA donde fue sustituida la cubierta de asbesto y colcoada la estructura de metal con lamina troquelada cal 26



Foto 9: MODULO A area de bodega donde fue sustituida la cubierta de asbesto y colcoada la estructura de metal con lamina troquelada cal 26

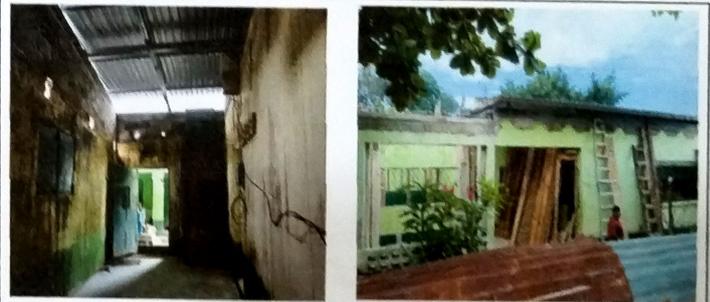


Foto 10: MODULO A del lado derecho donde fue sustituida la cubierta de asbesto y colcoada la estructura de metal con lamina troquelada cal 26, vista frontal donde se observa del lado izquierdo el area donde se esta realizadon el trabajo de emparrillado para losa de concreto armado.




Foto 11: MODULO B Este modulo ya fue concluido dandole mantenimiento a la estructura de metal y el cambio de lamina de zinc por troquelada cal 26.



Foto 12: MODULO B Este modulo ya fue concluido dandole mantenimiento a la estructura de metal y el cambio de lamina de zinc por troquelada cal 26.

Ruth Marineli Lopez B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma, Sello y Car. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333
