

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 COLONIA LA INDUSTRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0061-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo en el recorrido para supervisar y evaluar el avance de los trabajos de remozamiento cuando estos tienen un avance del 50%



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación a 2 manos de pintura anticorrosiva). Este trabajo se realizó en varios módulos de aulas pero no de manera simultanea, de tal manera que habían distintos avances en los módulos en el trabajo de remozamiento de techos.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación a 2 manos de pintura anticorrosiva). Proceso de pintado para estructura de uno de los módulos de aulas.



Foto 4: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Uno de los módulos se encuentra en el proceso de desmontaje de la lámina.




Foto 5: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos). Uno de los módulos donde ya se encuentran realizando los trabajos de instalación de lámina.



Foto 6: Luego de los trabajos en techos, se tuvo un remanente con el cual se puede remozar los módulos de baños, se puede observar la supervisión en el cambio de azulejos.


CONSEJO EDUCATIVO
COL. LA INDUSTRIA, ESC. LA

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 COLONIA LA INDUSTRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0061-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/07/2024



Foto 7: Con los remanentes luego del trabajo de techos se sustituyen los inodoros, se puede observar el espacio donde ya están desmontados los artefactos sanitarios.



Foto 8: También se logran realizar trabajos de herrería con la reparación y sustitución de puertas metálicas en los módulos de baños, estos trabajos son supervisados por la evaluadora de campo.



Foto 9: Como parte de los trabajos realizados con los remanentes se limpian los muros de los módulos de baños como parte del proceso de remozamiento con pintura interior y exterior.



Foto 10: Trabajos de resanado en muros durante el proceso de remozamiento con pintura en el módulo de aulas.

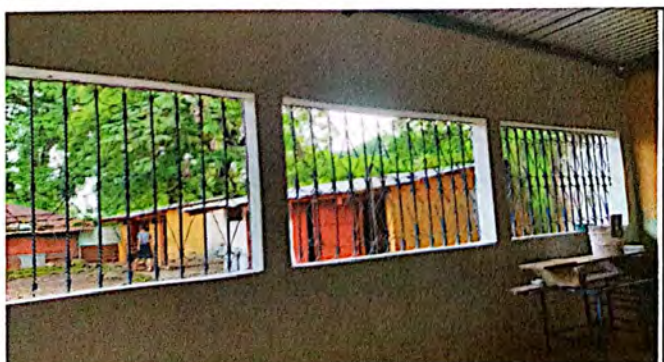


Foto 11: Uno de los módulos más adelantados en el proceso de remozamiento muestra los resultados de resanado en muros




Foto 12: Material almacenado en la escuela listo para ser utilizado en los trabajos de mejoras y remozamiento.



Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
COL. LA INDUSTRIA, ESCUINTLA



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

