

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en módulo del salón y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto 2: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en módulo del salón y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto 3: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en módulo del salón y pasillo de Segundo Grado Sección E.

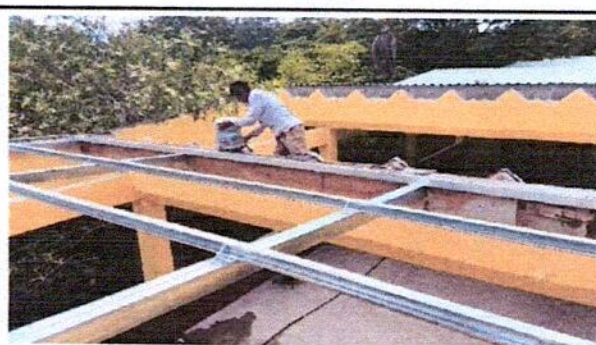


Foto 4: continuando con la instalación de los tubos y costaneras, se revisa que todo este bien antes de la instalación de las láminas



Foto 5: Instalación de tubos y costaneras en el módulo del Salón de Clases de Segundo Sección E, preparado para hacer la instalación de láminas



Foto 6: Instalación de tubos y costaneras en el módulo del Salón de Clases de Segundo Sección E, preparado para hacer la instalación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en el 2 módulos del salón clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto 2: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en los 2 módulos del salón de clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto 3: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en los dos módulos del salón de clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto 4: continuando con la instalación de los tubos y costaneras, se revisa que todo este bien antes de la instalación de las láminas.



Foto 5: Instalación de tubos y costaneras en los dos módulos del Salón de Clases y Pasillo de Segundo Sección F, preparado para hacer la instalación de láminas



Foto 6: Instalación de tubos y costaneras en los dos módulos del Salón de Clases y Pasillo de Segundo Sección F, preparado para hacer la instalación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



rev 5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 2: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 3: Después de haber realizado la demolición del techo de duralita, se procedió a hacer la instalación de los tubos y de las costaneras en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 4: continuando con la instalacion de los tubos y costaneras, se revisa que todo este bien antes de la instalación de las láminas, un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 5: Instalación de tubos y costaneras en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 6: Instalación de tubos y costaneras en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de noviembre de 2025



Foto 1: Después de haber hecho la demolición del techo y de haber instalado los tubos y costaneras, se procedió a restaurar los laterales de los canales de agua pluvial de un módulo de Salón y pasillo de Segundo Grado Sección E



Foto 2: Se reconstruyó los laterales de los canales de agua pluvial de un módulo y pasillo de Segundo Grado Sección E



Foto 3: La reconstrucción los laterales de dichos canales, se hizo con cemento y arena, rellenando las ondulaciones donde se encontraba la duralita un módulo y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto 4: Terminado la acción de rellenado de las ondulaciones de los laterales de los canales de agua pluvial, queda listo para instalación de la estructura de techado, en módulo de salón y pasillo de Segundo Grado Sección E.



Foto 5: Terminado la acción de rellenado de las ondulaciones de los laterales de los canales de agua pluvial, queda listo para instalación de la estructura de techado, en módulo de salón y pasillo de Segundo Grado Sección E.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ~~se debe~~ el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025



Foto 1: Después de haber hecho la demolición del techo y de haber instalado los tubos y costaneras, se procedió a restaurar los laterales de los canales de agua pluvial en el Salón de Clases de Segundo Grado Sección F



Foto 2: Se reconstruyó los laterales de los canales de agua pluvial



Foto 3: La reconstrucción los laterales de dichos canales, se hizo con cemento y arena, rellenando las ondulaciones donde se encontraba la durulita en los 2 módulos del salón de clases y pasillos de Segundo Grado



Foto 4: La acción de rellenado de las ondulaciones se hizo todos los canales de los 2 módulos del salón de clases y pasillo de Segundo Grado Sección F.



Foto 5: Terminado y esperando el secado de rellenado de las ondulaciones de los laterales de los canales de agua pluvial de los 2 módulos del salón de clases y pasillo de Segundo Grado Sección F, queda listo para instalación de la estructura de techado

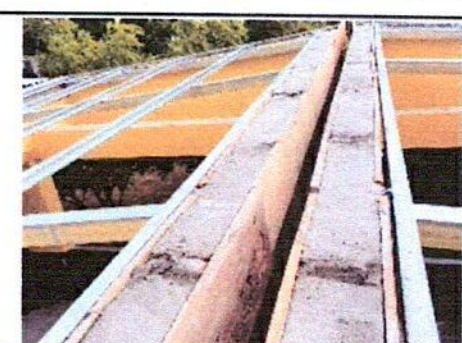


Foto 6: Terminado y Esperando el secado del rellenado de los laterales de los canales de agua pluvial, de los 2 módulos del Salón de Clases y pasillo de Segundo Grado Sección F, para la instalación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de Educación Media Experimental con Orientación Ocupacional "José Rodríguez Cerna"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida "A" y 9a. Calle Zona 2, Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0072-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025

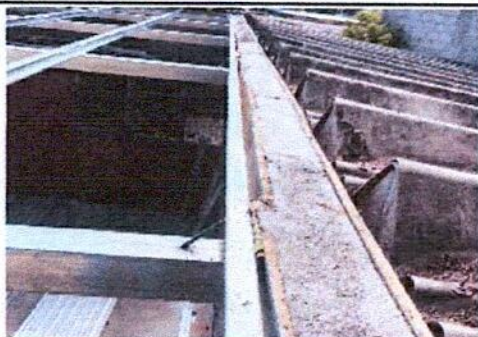


Foto 1: Después de haber hecho la demolición del techo y de haber instalado los tubos y costaneras, se procedió a restaurar los laterales de los canales de agua pluvial en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.

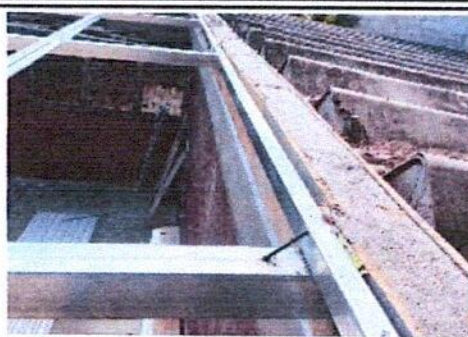


Foto 2: Se reconstruyó los laterales de los canales de agua pluvial en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.

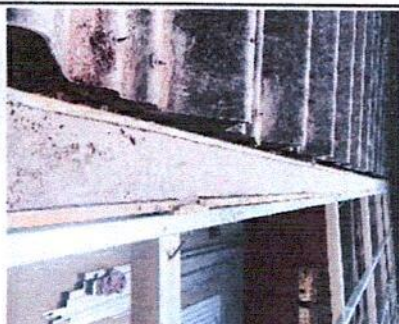


Foto 3: La reconstrucción los laterales de dichos canales, se hizo con cemento y arena, rellenando las ondulaciones donde se encontraba la duralita en un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 4: La acción de rellenado de las ondulaciones se hizo todos los canales de un módulo del Salón de Clases de área de carpintería.



Foto 5: Terminado y esperando el secado de rellenado de las ondulaciones de los laterales de los canales de agua pluvial de un módulo del Salón de Clases de área de carpintería, queda listo para instalación de la estructura de techado



Foto 6: Terminado y Esperando el secado del rellenado de los laterales de los canales de agua pluvial, un módulo del Salón de Clases de área de carpintería, para la instalación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Organización



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

