

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Virgen, Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0002-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Cambio de Estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Instalación de Gabinetes terrestres en cocina



Foto 3: Demolición y Extracción de piso de concreto en cocina

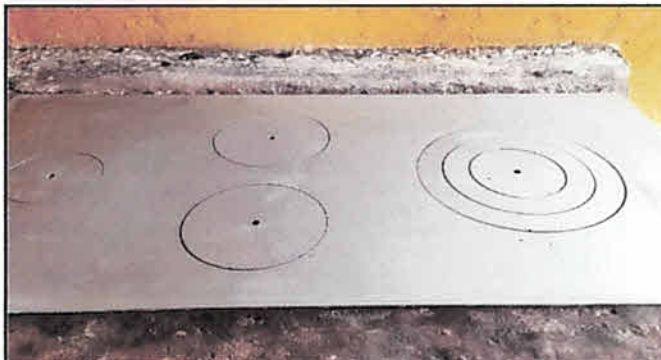


Foto 4: Instalación de Plancha de metal para estufa rural



Foto 5: Sustitución de Lámina por lamina troquelada calibre 26 en cocina



Foto 6: Instalacion de sistema electrico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Patricia Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Virgen, Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0002-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Sustitución de Lámina y estructura en galera



Foto 8: Demolición y Extracción de piso concreto en galera



Foto 9: Instalación de Deposito de Agua con Accesorios



Foto 10: Sustitución de accesorios en sanitarios




Foto 11: Reparación de Lavamanos



Foto 12: Zócalo de granciado de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Virgen, Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0002-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 13: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 14: Sustitución de Tubería principal



Foto 15 : Sustitución de Tubería principal



Foto 16: Reparación de muro en corredor con 6 columnas de 2 mts alto y 1 bigueta de 16 mts largo



Foto 17: Reparación de muro en corredor con 6 columnas de 2 mts alto y 1 bigueta de 16 mts largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Putz Si Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

