

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHAJ CANTON SAN LUIS SIBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de modulo 2, dos aulas y una cocina.

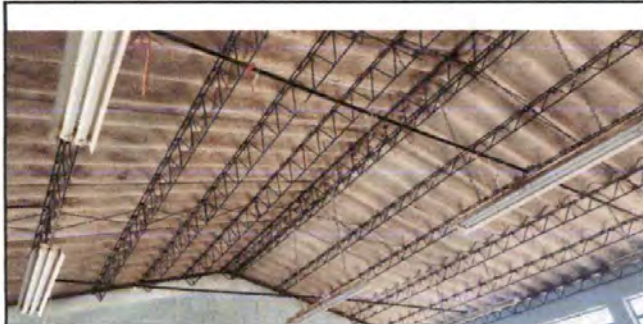


Foto 3: Vista interior de modulo 2, lamina existente de fibrocemento, se encuentra en mal estado. La estructura portante es tipo jois, necesario darle mantenimiento.




Foto 4: Vista interior de modulo 2, lamina existente de fibrocemento, se encuentra en mal estado.



Foto 5: Vista del pasillo del modulo 2, lamina existente de fibrocemento, se encuentra en mal estado.



Foto 6: Vista interior de modulo 2 en área de cocina, lamina existente de fibrocemento, se encuentra en mal estado.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Miguel Angel Vasquez Garcia
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHAJ CANTON SAN LUIS SIBILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Vista lateral de los baños.



Foto 8: Vista frontal de los baños.



Foto 9: Vista interior del baño, se observa la estructura portante y cubierta de lamina están en mal estado.




Foto 10: Vista de estructura portante y cubierta de lamina están en mal estado.



Foto 11: Vista de las puertas es necesario de los baños es necesario darle mantenimiento.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11881

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
