



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0108-43	FECHA:	05 de Diciembre de 2024.



Foto1: Módulo Muro Perimetral. Trabajo terminado de sustitución de malla por bolck en muro perimetral, altura de 1.50 metros.



Foto 2: Finalización de reparación de muro perimetral (repello y cernido).



Foto 3: Trabajo terminado en aplicación de Pintura en muros interior y exterior en terminado de cernido.



Foto 4: Finalización de mantenimiento de malla y pintura en tubos de metal en muro perimetral parte de atrás de aulas.



Foto 5: Trabajo finalizado en reparación de muro perimetral parte de atrás de aulas (repello y cernido).



Foto 6: Trabajo terminado en aplicación de pintura en muros interior en terminado de cernido parte de atrás de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0108-43	FECHA:	05 de Diciembre de 2024.

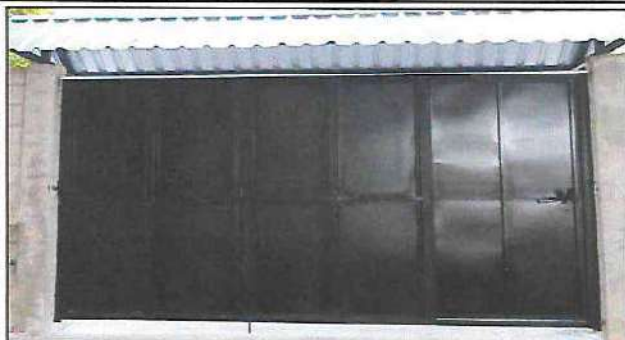


Foto 7: Módulo Portón. Trabajo terminado de sustitución de portón de metal de 2.71 metros de altura por 3.41 metros de ancho.



Foto 8: Trabajo finalizado de instalación de techo de lámina troquelada e instalación de estructura metálica arriba de portón.



Foto 9: Módulo Losa de Patio. Finalización de trabajo en sustitución de torta de piso de concreto con acabado alisado.



Foto 10: Módulo Cocina. Trabajo realizado en instalación de azulejo en meson de concreto.

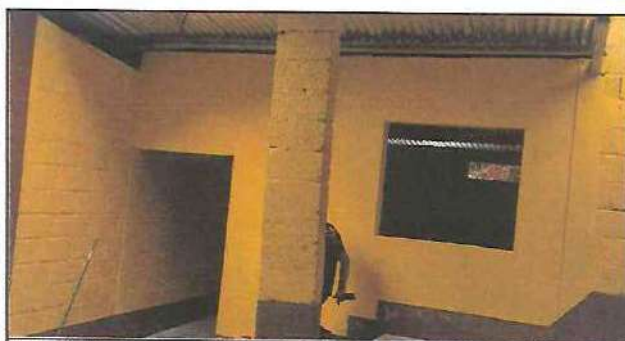


Foto 11: Módulo Cocina. Trabajo terminado en aplicación de pintura en muros interior y exterior en terminado de cernido.



Foto 12: Módulo Baños. Trabajo terminado de colocación de inodoro más accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---
