

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0071-41	FECHA:	26 DE ABRIL DEL 2025

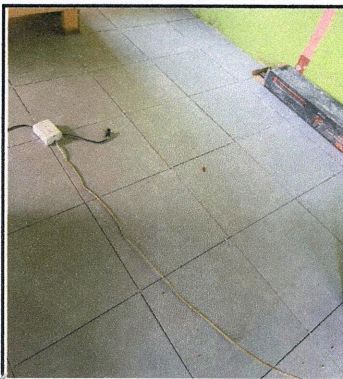


Foto1: Instalación de piso cerámico, pendiente estuque y limpieza final



Foto2: Avance de trabajos de aplicación de pintura impermeabilizante en aulas, eliminación total de hongo

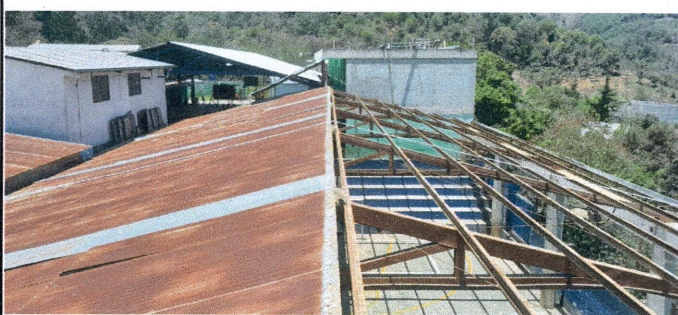


Foto 3: Avanzan trabajos de sustitución de lámina, se realiza el desmontaje total y se comienza a dar mantenimiento a estructura metálica



Foto 3: Se comienza con el mantenimiento de la estructura metálica, así mismo la colocación de lámina troquelada calibre 26, de 28 pies de largo, se verifica que todo esté alineado y se coloca atornillado a la estructura metálica



Foto 5: Avanzan trabajos de sustitución de lámina

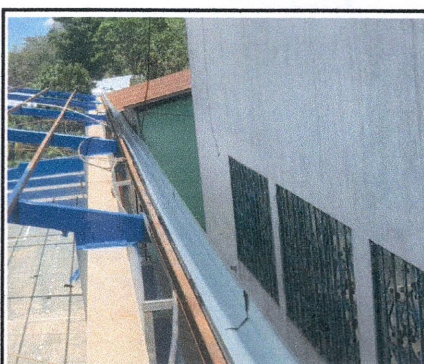


Foto 6: Se avanzan trabajos de sustitución de canal y bajadas pluviales tubo PVC de 3" y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

