

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	instituto Nacional de Educación Básica J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida 2-29 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-009-45	FECHA:	01/03/2024



Foto1: MODULO 1 PUERTAS : Mantrenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 2: MODULO 2 VENTANAS: Mantenimiento de marcos de ventanas de aluminio mil finisish, limpieza e instalación de vidiros faltantes.



Foto 3: MODULO 3 PISO: Sustitución suministro de piso cerámico



Foto 4: MODULO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MAOS DE PINTURA ACRILICA, ACABADO MATE, ANTI HONGOS.



Foto 5: MODULO 5/SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: sustitución suministro e instalación de llaves de paso de 1/2 sustitución suministro e instalacion de grifos 172



Foto 6: MODULO 6 MANTENIMIENTO DE BARANDAS: Reparación y mantenimiento de 17.00m2 de barandal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabella Marrero
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. AVE. 2-29 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0009-45	FECHA:	01/03/2024



MODULO 7/MANTENIMIENTO A PORTONES, Reparación y mantenimiento de porton de metal, lijado dos manos de pintura anticorrosiva y sustitución de piezas en mal estado, rectificación de

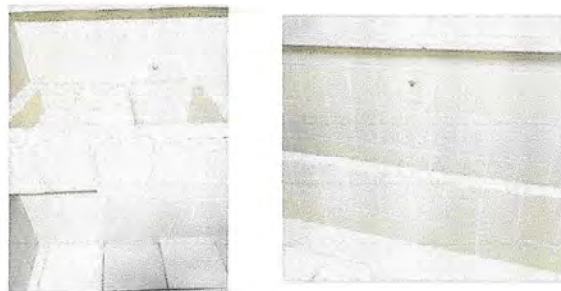

MODULO 8 REPARACIÓN O SUSTITUCION DE AZULEJO: Sustitución, suministro e instalación de azulejo en área de minitorio de area de pila de baño de varones.



MODULO 9: reparación de repello y cernido de paredes; Suministro aplicación de repello más cernido en 58.00m2 de muro, así como el sellado de grietas con material sika en 29.00m2.

Foto 2:

Foto 2: MODULO 8/CERNIDO Y REPELLO

Foto 6: MODULO 9/ FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Anabelma Marrero
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

