

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se repararon los daños estructurales en las puertas, especialmentes en las puertas rotas y deterioradas de la parte inferior, esto incluyó la soldadura y refuerzo de las secciones dañadas.



Se instaló la nueva puerta del portón, asegurando un ajuste correcto y la alineación adecuada.



Se instaló la nueva chapa en la puerta, asegurando un ajuste correcto y una alineación adecuada, se realizaron las conexiones necesarias para garantizar su funcionamiento eficiente.



Se instalaron los nuevos canales y bajadas de agua pluvial, asegurando un ajuste correcto y una alineación adecuada.



Se vertió y niveló el nuevo concreto en las áreas preparadas, asegurando una superficie uniforme y segura.



Se ha completado con éxito la renovación del exterior de las aulas, las paredes ahora presentan un aspecto fresco con un color uniforme y atractivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se instalaron los nuevos inodoros, asegurando un ajuste correcto y la conexión adecuada a los sistemas de suministro y desagüe de agua.



Se instaló nuevo material de PVC para los sifones, tubos y codos, reemplazando los componentes antiguos y dañados para corregir las filtraciones y el desperdicio de agua.




Se realizó reparaciones estructurales, incluyendo soldaduras para reforzar las áreas debilitadas, se aplicó una capa de pintura de alta calidad, se ajustó y lubricó el sistema de apertura del portón.



Se instaló un nuevo techo de lámina, asegurando un ajuste correcto y la fijación adecuada con costaneras y tornillos nuevos.



se reemplazó la rejilla faltante en la reposadera para evitar que la basura se acumule en el futuro.

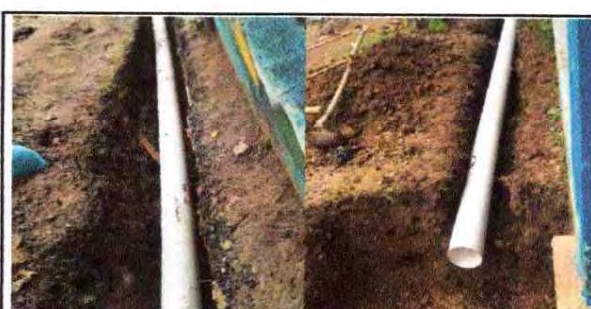

Se instaló una nueva tubería de PVC de alta calidad, diseñada para ser resistente a la corrosión y duradera de largo plazo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se procedió a limpiar y desinfectar el interior de la foas séptica para eliminar bacterias y malos olores.




Se instaló una nueva caja de registro y Se realizaron pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de la nueva caja de registro y la eficacia del sistema de drenaje.



Se llevó a cabo un refuerzo estructural en las nuevas secciones elevadas para garantizar la estabilidad y resistencia.



Se instaló cada lámpara LED en las luminarias correspondientes, asegurando una conexión eléctrica segura y eficiente.

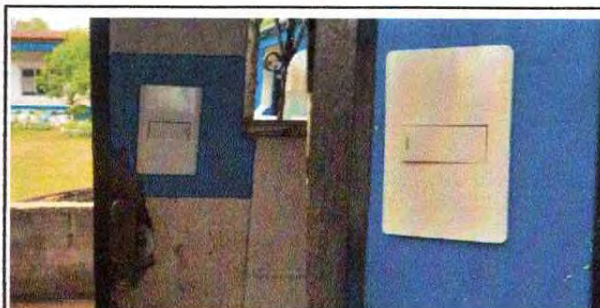

Se instaló cada nuevo interruptor en las ubicaciones correspondientes, asegurando una conexión eléctrica segura y eficiente.



Se instaló cada nuevo tomacorriente en las ubicaciones correspondientes, asegurando una conexión eléctrica segura y eficiente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024




Se instaló el nuevo tablero eléctrico y los flippers en las ubicaciones correspondientes, asegurando una conexión eléctrica segura y eficiente.




Se instaló el nuevo cableado eléctrico en todas las áreas necesarias, utilizando materiales adecuados y siguiendo las especificaciones técnicas.



Se instaló la columna en la nueva ubicación de acuerdo con las especificaciones técnicas y de seguridad.

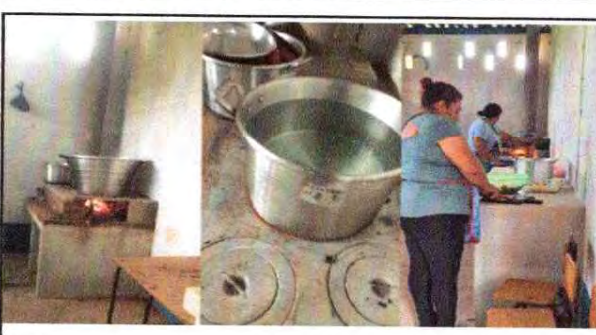


Se instaló la nueva chimenea de metal y estufa rural, asegurando un adecuado sellado y con las modificaciones necesarias.

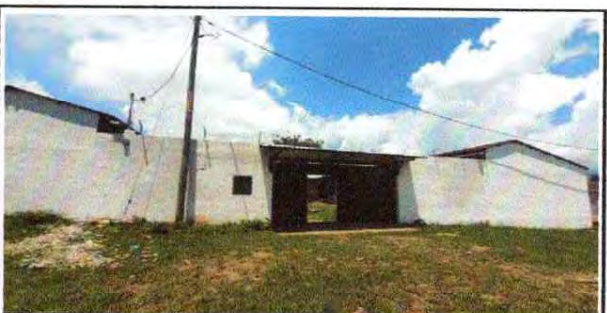

Se procedió a nivelar y alisar la superficie del repello aplicado, asegurando una apariencia uniforme y suave.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
