

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0992-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Trámiento a Base de Piso Líquido Existente para Cambio a PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE para MODULO DE AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR DE AULAS Y EN COCINETA.



Foto 2: Cambio a PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE para MODULO DE AULAS, DIRECCIÓN, CORREDOR DE AULAS Y EN COCINETA.



Foto 3: Esté Renglón de Trabajo, incluye 3 Sub-Renglonés: 2 Luminarias, 2 Interruptores Simples y 1 Tomacorriente para el Area de COCINETA.



Foto 4: Este Renglón contempla la Reparación, Lijando la Pintura Existente y la Aplicación de Pintura Anticorrosiva en 2 Manos para Puertas y Balcones, así como también cambio de 2 Chapas.



Foto 5: Mantenimiento Correctivo a Portón de Marco de Tubo y Malla Galvanizada Y Balcones Metalicos. Debiendose Lijar, quitar Pintura y Aplicar 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR SEGÚN SUPERVISOR.



Foto 6: Cambio de Accesorios tales como: Flote, Válvulas Plásticas y Subida y Bajada independiente, para el Deposito de Agua Existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0992-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 7: Debe instalarse Caja para Valvulas, Llave Cheque, Cambiar Chorro e Independizar la Subida de Agua al Deposito de la Bajada de manera Individual para ambas.

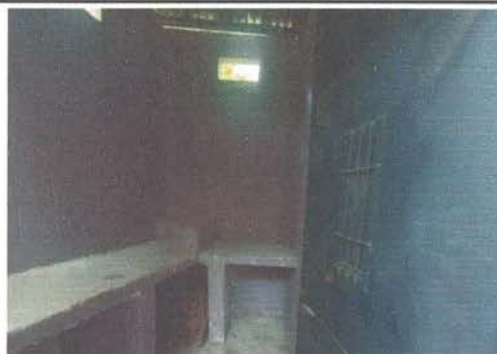


Foto 8: Se contempla la Instalación de 1 Estufa Rura con su Chimenea Metalica en Tubo Galvanizado Ø 3" con sus respectivos Accesorios.



Foto 9: Impermeabilizar Deposito de Pila de Concreto Existente.



Foto 10: Levantando de Pared h=1.00mts. Para posteriormente Fabricar e Instalar 1 Balcón Metálico de 1.00 x 1.10 mts.



Foto 11: Se estima poder cumplir con la Pintura para Exteriores e Interiores con Pintura Latex para todo El Establecimiento. NO APLICA ROTULACION DE ESCUDO O LETRAS.



Foto 12: Dentro de este Renglón Especial, se considera la necesidad de Realizar una Limpieza a la Fosa Septica Existente y la Construcción de 1 Pozo de Absorción para que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales quede funcionando correctamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rita Tatalina
Firma y sello del Presidente de la ORE

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

