



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Najtilabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0212-43	FECHA:	22 de abril de 2025

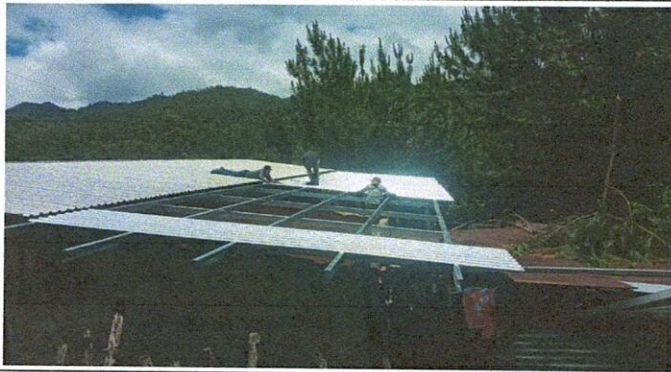


Foto 1: el estado de la laminas esta en mal estado por tal razon es necesario el cambio de laminas por nuevas y tambien el cambio de la estructura metalicas para darle un mejor aspecto al corredor de la escuela.



Foto 2: las condiciones en que se encuentran las laminas y capote en esta parte del establecimiento por las condiciones admosfericas, siendo necesario el cambio por nuevas.



Foto 3: la estructura metalica en el corredor de la escuela no reúne las condiciones de seguridad para los alumnos.



Foto 4: las chapas de primero primaria, cuarto y la bodega estan en muy malas codiciones siendo muy necesario reemplazarlos en nuevos.



Foto 5: las puertas de los baños ya estan en muy mal estado como tambien los inodoros, por tal motivo es necesario el mantenimiento a puertas y cambio de inodoros.



Foto 6: el estado actual del modulo de 6 bañoes esta dañado, esta inclinado y ya no esta a nivel por tal motivo es necesario la rehabilitacion de las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maurilio Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea Najtilabaj
ESTABLECIMIENTO:	16-03-0212-43	FECHA:	22 de abril de 2025

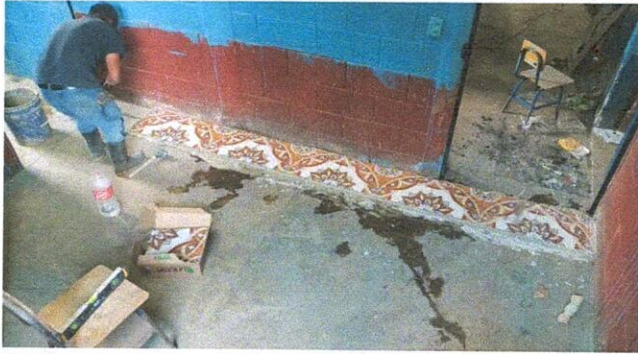


Foto7: inicio de colocacion de piso ceramico en la cocina



Foto 8: colocacion de plancha losa de piso en el corredor.



Foto 9: sustitucion del tinaco de 2,500 lts.

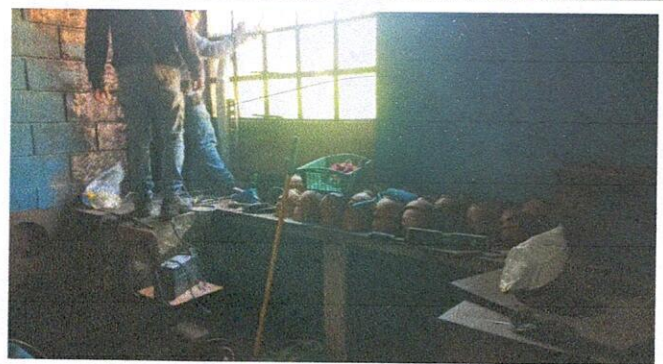


Foto 10: cambio de planchas y chimenea

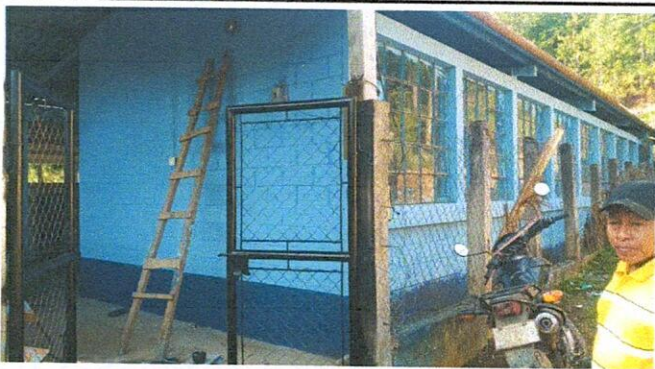


Foto 11: pintado en paredes exteriores e interiores

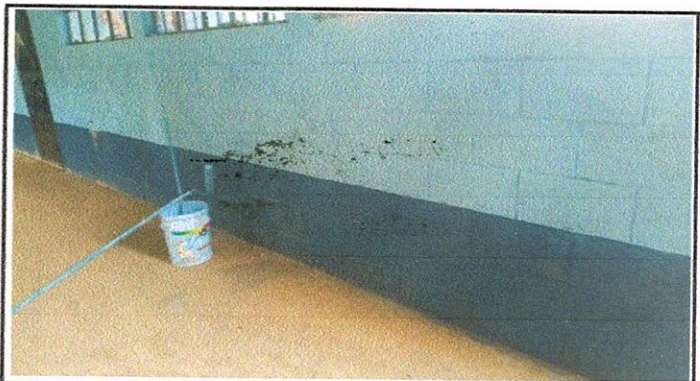


Foto 12: colocacion de pintura de aceite en las paredes inferiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Calixoy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

