

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. CALLE ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0633-42	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes exteriores del establecimiento.



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos



Foto 3: PISO
Sustitución de piso de granito por piso cerámicos antidelizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En area de corredor

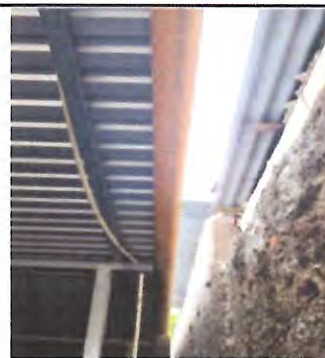


Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos





Foto 5: PISO
Sustitución de piso de antidelizante por piso cerámicos antidelizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En fachada de pared de aulas



Foto 6: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas. Perfiles color blanco estandar. Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. CALLE ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0633-42	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.

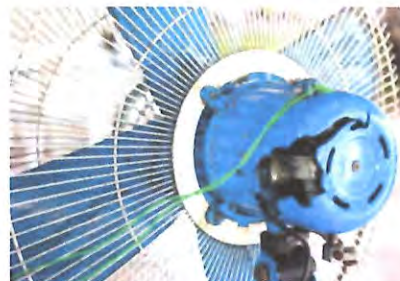


Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

sustitucion de sistemas de iluminación: Ventiladores



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Sustitución de sistemas de iluminación: tornacorrientes de pared en caja base metálica atornillada y caratula plástica



Foto 10: CUBIERTA DE LÁMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. En area de ingreso de establecimiento



Foto 11: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 12: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura En area de ingreso de establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
EOD No. 2 JV
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SANARATE, EL PROGRESO

Firma y sello Director Centro Educativo Público
Jornada Vespertina
SANARATE, EL PROGRESO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0633-42	FECHA:	06/06/2025



Foto 13: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico. En area de corredor y area de bancas.



Foto 14: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 15: MANTENIMIENTO A PORTONES

Sustitución a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre. 5 mts de largo * 2.5 mts de alto

Foto 16:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--
