

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Cantón Las Pilas Canalitos Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17.7489-43	FECHA:	5/09/2025



2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal
Sustitución de estructura portante de metal con soldadura eléctrica con tubos cuadrados de 2"2 pulgadas chapa 16, soportadas con soldadura eléctrica a estructuras, incluye aplicación de pintura color azul institucional.
Área de portón entrada principal.



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de lámina troquelada E25 ALUZINC calibre 26 con tornillos tipo pulser de 5/16 x 2 pulgadas de largo y aplicación de sikflex en tornillos.
Área de portón entrada principal.




1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
Sustitución de capote para lámina troquelada en techo con tornillos tipo pulser de 5/16 x 2 pulgadas de largo y aplicación de sikflex en uniones y tornillos.
Área de techo de portón entrada principal.



1.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por tubo PVC 3
Sustitución e instalación de bajadas de agua pluvial de PVC por tubería de PVC de 3 pulgadas (Incluye tubería de PVC de 3 y 2 pulgadas con sus respectivos accesorios, (uniones codos a 45 grados, codos a 90 grados, abrasaderas de hierro plano de 1/2 pulgada por 1/8 de pulgada, tarugos expansibles y tornillería). Aplicación de pintura de aceite de secado rápido color azul institucional).



4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).
Mantenimiento a puertas de metal, incluye lijado, cepillado, lubricación y aplicación de pintura anticorrosiva color azul institucional de secado rápido.
Puertas de salones de clase.

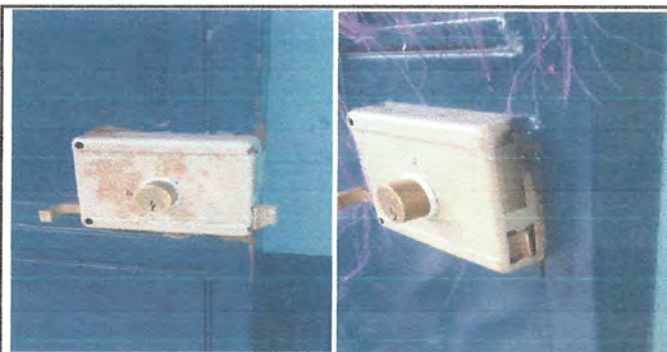

4.2 Sustitución de chapa
Suministro e instalación de chapa "YALE" en puertas sujetadas con soldadura eléctrica.
Áreas de creche, baños de niños y aulas de sexto y preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Cantón Las Pilas Canalitos Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17.7489-43	FECHA:	5/09/2025

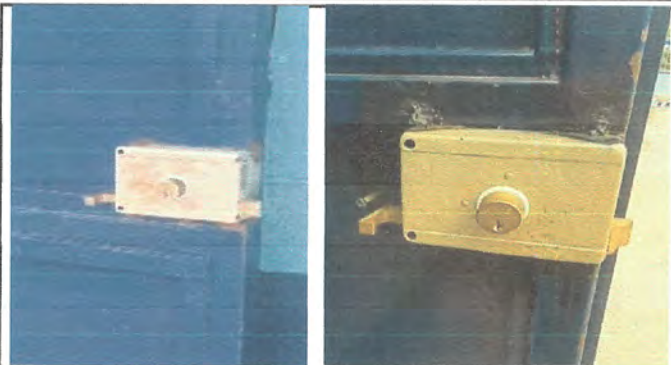

4.2 Sustitución de chapa
Suministro e instalación de chapa "YALE" en puertas sujetadas con soldadura eléctrica.
Áreas de crea, baños de niños y aulas de sexto y preprimaria.



10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios.
Mantenimiento a puertas de metal, incluye lijado, cepillado, lubricación y aplicación de 2 capas de pintura anticorrosiva color azul institucional de secado rápido.




11.1 Mantenimiento a barandas de metal
Mantenimiento a barandas de metal, incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul institucional de secado rápido.
Área de aulas y pasillos de primero y segundo nivel.



11.1 Mantenimiento a barandas de metal
Mantenimiento a barandas de metal, incluye lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva color azul institucional de secado rápido.
Área de aulas y pasillos de primero y segundo nivel.




18.5 Sustitución de accesorios depósito de agua
Sustitución de accesorios de depósito de agua incluye válvula flote de cisterna de 1 pulgada, válvula de pie de 1 pulgada instalaciones se realizaron con teflón y pegamento marca Tangit
Cisterna de agua.

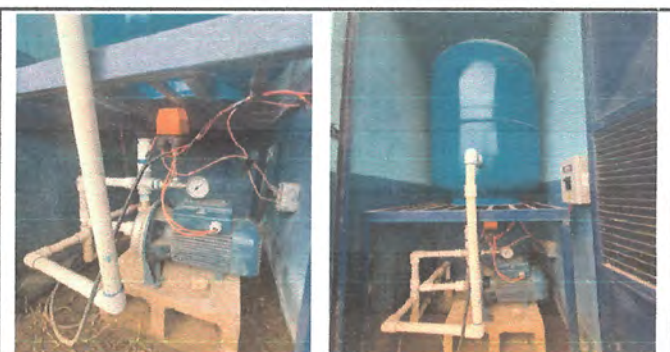

16.0 Reparación de bomba de agua
Mantenimiento correctivo y preventivo a sistema eléctrico de bomba.
Incluye: instalación de ductería eléctrica, guarda nivel tipo flote, switch de presión, caja de registro con circuito de mando para automatización de apagado y encendido de bomba en horas de funcionamiento con un contactor de 30 amp, programador semanal y soportes de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizadas a las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CRE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 20 Manzana 3 Cantón Las Pilas Canalitos Zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17.7489-43	FECHA:	5/09/2025



19.11 Instalación de unidades luz
Sustitución de plafoneras con foco led de 12 watts, cable calibre 12, tubería y accesorios en pvc de 3/4 y accesorios de fijación.
Area sanitarios de niñas y maestros.





19.11 Instalación de unidades luz
Sustitución de interruptores simples y accesorio de fijación.
Area sanitarios de niñas y maestros.



Red de agua potable
14.9 Sustitución de tubería línea principal
Sustitución e instalación de tubería de agua potable de 1/2 pulgada PVC incluye: fabricación de caja de registro para llaves de paso, válvula check llaves de paso aplicación de pegamento tangit, sujeta con abrazaderas media luna de 1/2



9.1 Pintura en muros exteriores e interiores
Suministro y aplicación de pintura latex de exteriores e interiores con colores institucionales indicados.
Aulas, dirección JV, baños y pasillos.

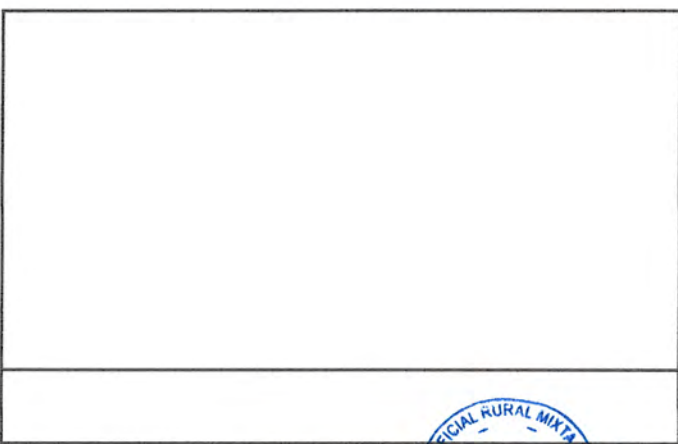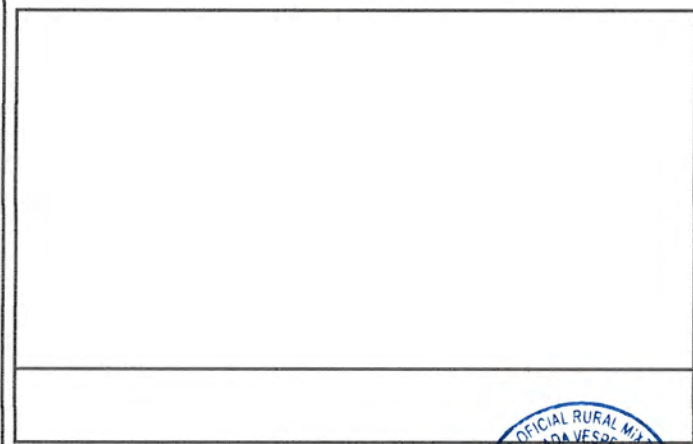

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
