

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Asunción Chivoc, Comunidad de Ruiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7333-41	FECHA:	3/02/2025



Foto 7: Sustrucción de distribución de energía eléctrica en módulo 1, aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, incluyendo el corredor, el cableado se encuentra en mal estado y no cuenta con cubierta de pvc de seguridad.



Foto 8: Sustrucción de accesorios de energía eléctrica en módulo 1, aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, incluyendo el corredor.



Foto 9: Reparación de tubería de drenaje de lavamanos de los sanitarios.



Foto 10: Reparación de tubería de drenaje de lavamanos de los sanitarios.



Foto 11: Reparación de pollo de leña



Foto 6: Reparación de pollo de leña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Asunción Chivoc, Comunidad de Ruiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7333-41	FECHA:	3/02/2025



Foto 7: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del módulo 1, (30 plafoneras, 18 tomacorrientes, 12 interruptores incluye sustitución de cableado y unidades existentes por nuevas)



Foto 8: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del módulo 1, (30 plafoneras, 18 tomacorrientes, 12 interruptores incluye sustitución de cableado y unidades existentes por nuevas)



Foto 9: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del módulo 1, (30 plafoneras, 18 tomacorrientes, 12 interruptores incluye sustitución de cableado y unidades existentes por nuevas)

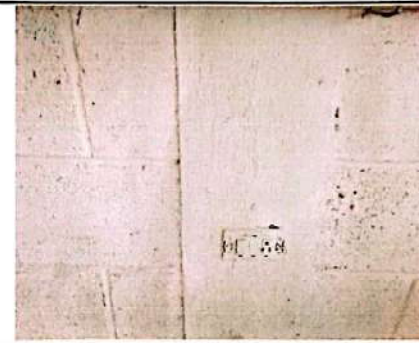


Foto 10: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del módulo 1, (30 plafoneras, 18 tomacorrientes, 12 interruptores incluye sustitución de cableado y unidades existentes por nuevas)



Foto 11: Instalación eléctrica en aula 1, 2, 3 y 4 del módulo 3.



Foto 6: Instalación eléctrica en aula 1, 2, 3 y 4 del módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---
