



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		ALDEA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Cubierta de Lamina: Sustitucion de techo madera en Patio de reuniones de acto civico para estudiantes 233 alumnos.

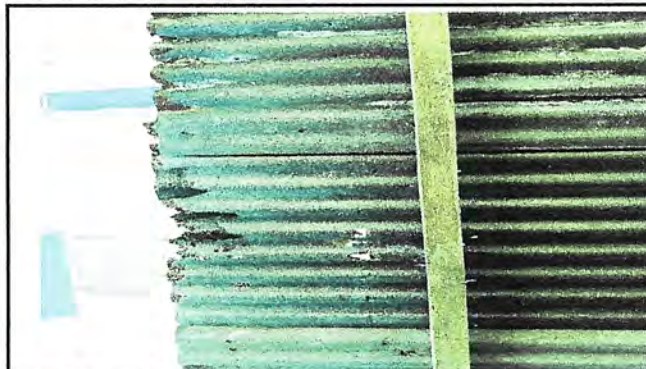


Foto 2: Por Estructura de metal y lamina troquelada calibre 26, cubriendo una area de 8m x 9m metros cuadrados de 72M2 doble altura e instalacion de bajadas de 4 pulgadas x 6 metros de largo.



Foto 3: Cubierta de Lamina Patio de reuniones para estudiantes y padres de familia.



Foto 4: Sustitucion de techo de madera en patio de reuniones con estructura cubriendo una area de 9m por 8m doble altura 72m2 doble altura e instalacion de dos bajadas de 4 pulgadas x 6 metros de largo.



Foto 5: Losa de patio sustitucion de losa de patio area posterior de modulo de salones desde el inicio de modulo de salones hasta el modulo de baños.



Foto 6: con fundicion de concreto de 0.075 cm de peralte incluye aplanado compacto de suelo y fundicion por plancha 1.50 x 1.50 con total de 104.50m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Domínguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Cerco o Muro Perimetral: Continuación de Cerco o Muro Perimetral Agregando 1 metro de levantado de Block.



Foto 2: Por 43 Mts de largo con block y continuación de fundion de columnas existentes. + Instalacion de Ryzor Rybon sobre el muro Perimetral con dos hileras con su respectivo soporte de muro

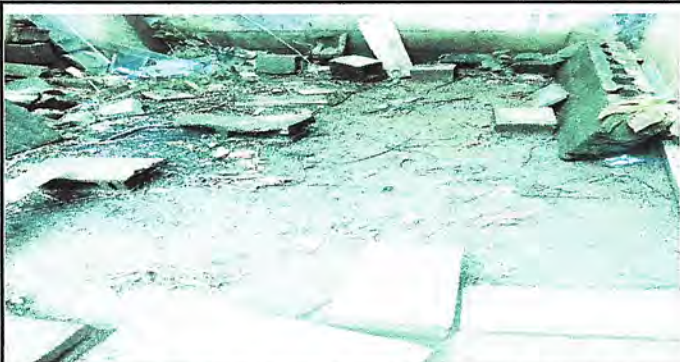


Foto 3: Losa de Patio: Sustitucion de losa de patio area posterior de salones desde el inicio de salones hasta el modulo de baños .



Foto 4: Con fundicion de concreto de 0.075cm de peralte incluye aplanado compactado de suelo y fundición de plancha de 1.50. x 1.50 con total de 104.50m2



Foto 4: Con fundicion de concreto de 0.075cm de peralte incluye aplanado compactado de suelo y fundición de plancha de 1.50. x 1.50 con total de 104.50m2



Foto 6: Continuacion cerco de muro Perimetral agregando 1 metro de levantado de Block por 43 mts de largo con block y continuacion de fundicion de columnas existentes + instalacion de Ryzor Rybon Inoxidable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

