

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM NO. 701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6089-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (Instalación de cubierta de lámina en área de ingreso principal con medidas de 10.50x5.50, iniciando desde módulo salones principal hasta delimitar los 10.50 mts + instalación de cubiera en



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Instalación de canal metálico de ancho de 0.20, alto frontal de 0.17x alto posterior de 0.17mts, con doble ceja para refuerzo en ambos laterales, con una longitud de



Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE (Reparación de área de área de pila, sustitución tubería en mal estado con una longitud de 7.50 mts con tubería de 6 pulg. + implementación de



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO (Implementación de cuneta de concreto con piezas prefabricada, o en su defecto con tubo de 13pulgadas partido a la mitad, + bordillo y base fundida para una longitud de 31mts. +



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (implementación de mueble tipo L, implementación de mueble aéreo de concreto, puertas de metal lisas.



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (Sustitución de pared provisional por pared formal de block, en área de salón de clase, con 4 columnas de 0.15x 0.20 de 4 hierros de 3/8 y estribos a cada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Carolina Aguilar Martinez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM NO. 701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6089-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 7 PUERTAS (mantenimiento de 7 puertas y el portón principal; lijado, pintado a dos manos y reajuste de niveles)

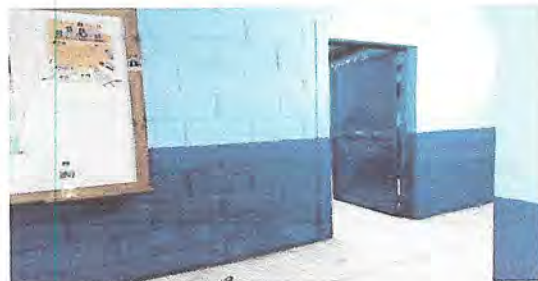


Foto 8: VENTANAS (Sustitucion de ventanas en area de salon de direccion)

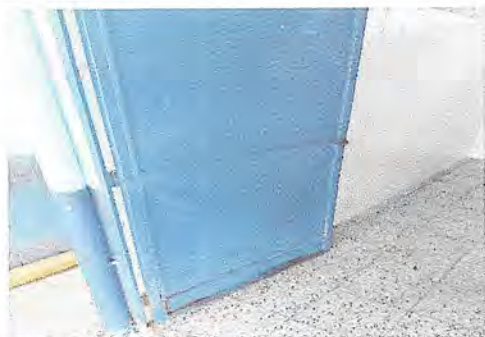


Foto 9: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (Instalacion de lavamanos y sustitucion de inodoro elongado en baño de maestros + instalacion azulejo en fondo baño)



Foto 10: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (Pintura de 210 m2 en distintas areas del centro educativo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Carolina Aguilar Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

