

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 630	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristobal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7523-42	FECHA:	24/02/2025



Foto1: Mantenimiento a Porton metalico de 4.00x 2.40 mts como reparacion de deformaciones, corrosión o desgaste en visagras, rieles y metal mismo de cierre



Foto 2: reparacion de muro perimetral



Foto 3: fabricacion de columnas de 0.20 por 0.20 de 2.80 de alto visible



Foto 4: asi mismo cada una llevará una zapata de 0.60 x 0.60. terminado de muro sisado sobre el muro existente con un agregado de 140.00 m2

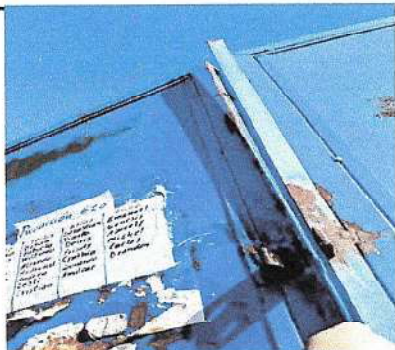


Foto 5: sustitucion de estructura de techo y cepillado



Foto 6: implementación de muro como soporte para el portón principal de metal, cubierta de lámina instalación de estructura para cubierta del portón principal de ingreso, reparación de sistema electrico de timbre

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juanita Nolasco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM No. 630	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7523-42	FECHA:	24/02/2025




Foto1: levantamiento de paredes, terminado de muro sisado



Foto 2: levantamiento de paredes terminado de muro sisado



Foto 3: instalacion de chapa en los salones



Foto 4: instalacion de chapa en los salones



Foto 5: Cambio de chapa del portón principal, ajuste de tornillos y soldaduras, aplicación de dos manos de pintura tipo esmalte o poliuretánica, según exposición a la interperie



Foto 6: instalacion de chapa en los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A No. 630	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7523-42	FECHA:	24/02/2025



Foto 1: Levantamiento de muro de perimental



Foto 2: complemento de 25 columnas de 0.20x0.20 y altura de 2.80 mts de alto



Foto 3: terminado en muro sisado sobre el muro existente



Foto 4: así mismo cada una llevara una zapata de 0.60x 0.60

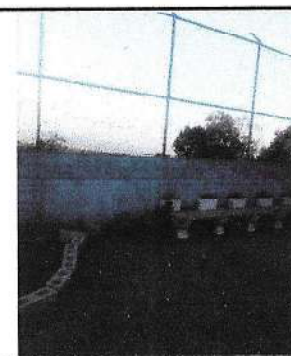


Foto 5: terminado en muro sisado sobre el muro existente



Foto 6: Instalacion de razor ribbon sobre todo el muro indicado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Marrero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

