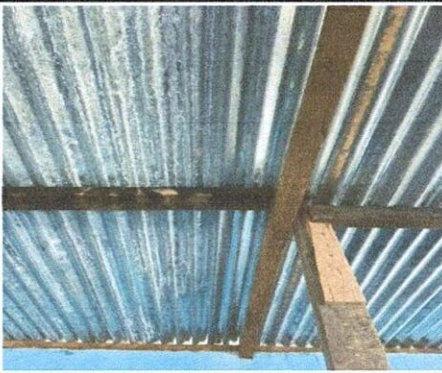
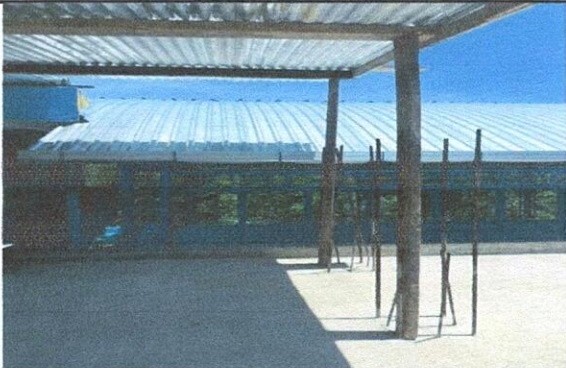
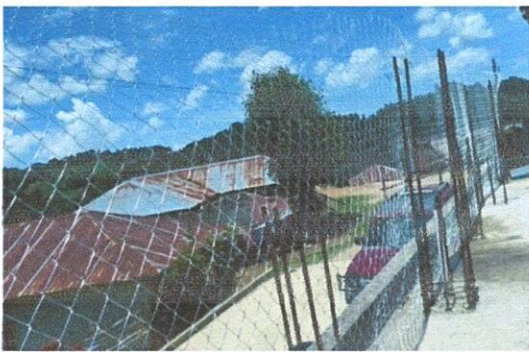


|                                      |                |        |          |                                |                        |           |  |
|--------------------------------------|----------------|--------|----------|--------------------------------|------------------------|-----------|--|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: |                | PREVIO | <b>X</b> | DURANTE                        |                        | POSTERIOR |  |
| DEPARTAMENTO:                        | QUETZALTENANGO |        |          | MUNICIPIO:                     | SIBILIA                |           |  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:          | EORM           |        |          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA COLONIA CHIQUITA |           |  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:          | 09-05-0009-43  |        |          | FECHA:                         | 7/07/2025              |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Sustitución de lamina por lamina troquelada 0.38 calibre 26 en techo de madera en Aula módulo 1.</b></p>                                     |  <p><b>Sustitución de estructura de soporte de madera, por estructura metalica tubo rectangular galvanizado de 6"x4" con chapa 16" para vigas en Aula módulo 1.</b></p>                 |
|  <p><b>Sustitución base de madera por base de metal costanera de 6"x2" cuachada más pedestal de concreto y platina de metal Aula módulo 1.</b></p> |  <p><b>Sustitución malla galvanizada existente por malla galvanizada calibre 13 cuadros de 2x2 por 1.50 de alto más tubo galvanizado de 1 1/2" (11 unidades) en Aula módulo 1.</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><i>onelia mazasiegos</i></p> <p align="center"><small>Firma y sello del Presidente de la OPF</small></p> | <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center"><small>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</small></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
