

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PILAR CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0046-45	FECHA:	27/10/2025



1. Sustitución de muro perimetral, por muro perimetral prefabricado de placa y poste de concreto. Altura 2.5m. (72.50 m2).

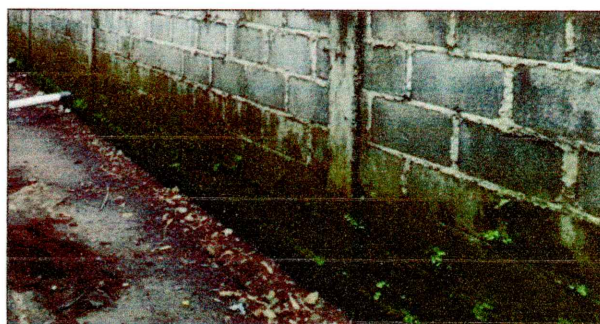

2. Sustitución de emplantillado de muro, por emplantillado de muro de block 0.15m X 0.20m X 0.40m. Y pastilla de concreto de 0.20m X 0.40m para mejora en estabilización de suelo. (46.40 m2).



3. Mantenimiento de muro en baños. (15.00 m2).



4. Sustitución de emplantillado de muro, por emplantillado de muro de block 0.15m X 0.20m X 0.40m. Y pastilla de concreto de 0.20m X 0.40m para mejora en estabilización de suelo. (9.60 m2).



5. Sustitución de puerta, por puertas de metal para baño. (3.00 Unidades).



6. Mantenimiento de inodoro. (3.00 Unidades).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PILAR CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0046-45	FECHA:	27/10/2025

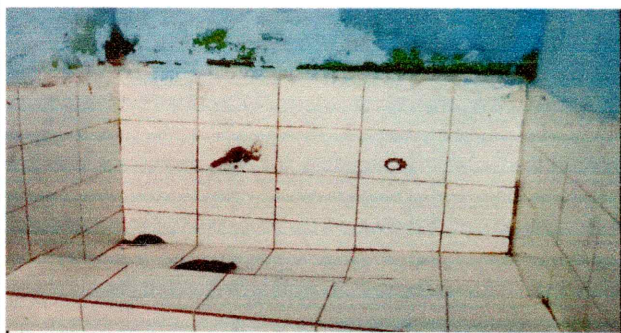 7. Sustitución de chorro, por chorro en lavamanos. (2.00 Unidades).	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alma N. Romero</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--
