

SITUACIÓN DE FICHA DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PILAR CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0046-45	FECHA:	01/12/2025



1. Sustitución de muro perimetral, por muro perimetral prefabricado de placa y poste de concreto. Altura 2.5m. (72.50 m2).




2. Sustitución de emplastado de muro, por emplastado de muro de block 0.15m X 0.20m X 0.40m. Y pastilla de concreto de 0.20m X 0.40m para mejora en estabilización de suelo. (46.40 m2).



3. Mantenimiento de muro en baños. (15.00 m2).



4. Sustitución de emplastado de muro, por emplastado de muro de block 0.15m X 0.20m X 0.40m. Y pastilla de concreto de 0.20m X 0.40m para mejora en estabilización de suelo. (9.60 m2).

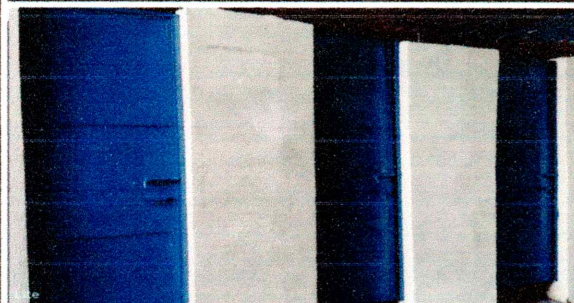

5. Sustitución de puerta, por puertas de metal para baño. (3.00 Unidades).



6. Mantenimiento de inodoro. (3.00 Unidades).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alma N. Ramos</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--




SITUACIÓN DE REQUERENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PILAR CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0046-45	FECHA:	01/12/2025

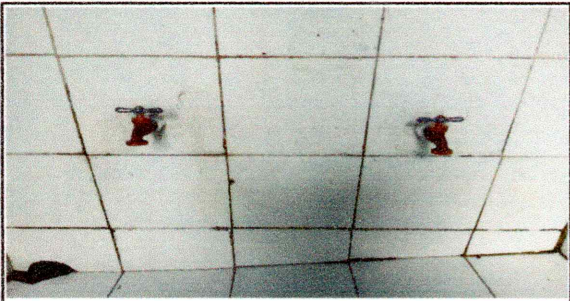	
7. Sustitución de chorro, por chorro en lavamanos. (2.00 Unidades).	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alma N. Ramon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--

