

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0088-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 1: Se observa la puerta en el modulo de aulas 1, las bisagras están caídas y se encuentra picada, debe ser sustituida.



Foto 2: Se observa que los balcones se encuentran muy deteriorados y ya no cumplen su función de protección, por lo que hay que cambiarlos.



Foto 3: Se observa que el piso en las aulas del modulo 1 es de concreto, se debe instalar piso cerámico.



Foto 4: Se observa que en ciertas partes del modulo se esta cayendo el repello, como son las columnas y los marcos de las puertas, y deja al descubierto el concreto o block, es necesario aplicarlo nuevamente.

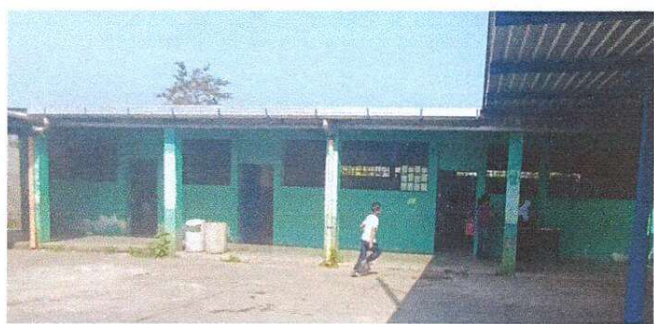


Foto 5: Se observa que el modulo 1 debe ser pintado nuevamente, pues ya se encuentra muy manchado, además de que habrán partes que serán repelladas y deben cubrirse con pintura.



Foto 6: Se observa el mal estado de la puerta en el modulo de aulas 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0088-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 7: Se observa que el piso en las aulas del modulo 2 es de concreto rustico y los niños pueden raspase, debe instalarse piso cerámico.



Foto 8: Se observa la pared del modulo 2, al cual se le aplicara pintura en muros pues esta se encuentra ya manchada.



Foto 9: Se observa que no se cuenta con inodoros, se los robaron. Es necesario suministrar nuevamente para poder contar con el servicio.



Foto 10: Se observa que la estación de lavado ya no es funcional y se desea sustituir por una estación de lavado de concreto y azulejo con 3 grifos.



Foto 11: Se observa que el muro perimetral cerca de los servicios sanitarios no cuenta con repello, por lo que se necesita que se le aplique. De igual manera se observa que no cuenta con cernido, y se le deberá aplicar luego del repello.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

