

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0389-43	FECHA:	19/12/2025



Foto1: Suministro de 98 metros cuadrados de lámina troquelada calibre 26, más estructura de metal, en área de pasillo, ingreso y egreso del establecimiento.



Foto2: Suministro de 98 metros cuadrados de lámina troquelada calibre 26, más estructura de metal, en área de pasillo, ingreso y egreso del establecimiento.



Foto 3: Reparación de canal de concreto agua fluvial colocándole impermealizante.



Foto 4: Mantenimiento de 35 metros lineales de baranda principal, (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva).

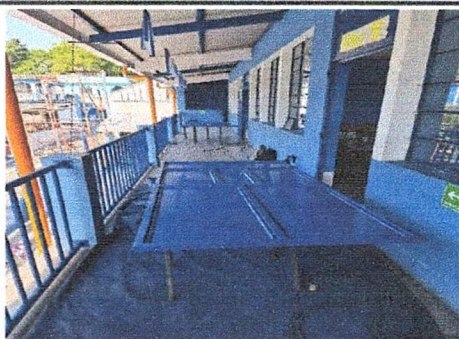


Foto 5: Mantenimiento de 11 puertas principales de aulas, 1.80 x 1.00 (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



Foto 7: Mantenimiento de 11 puertas principales de aulas, 1.80 x 1.00 (lijado, cepillado con 2 manos de pintura anticorrosiva)

[Firma]

Lisbeth Lacán Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Carlos Humberto Martín González
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camaché Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0389-43	FECHA:	19/12/2025



Foto 7: Mantenimiento de cernido y repello de pared 92 metros cuadrados, modulo de cancha escolar y calle.

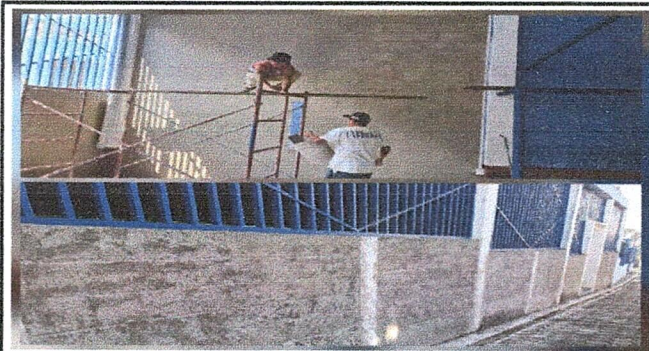


Foto 8: Mantenimiento de cernido y repello de pared 92 metros cuadrados, modulo de cancha escolar y calle.



Foto 9: Mantenimiento 10 metros cuadrados de pila de concreto con instalación de azulejos.

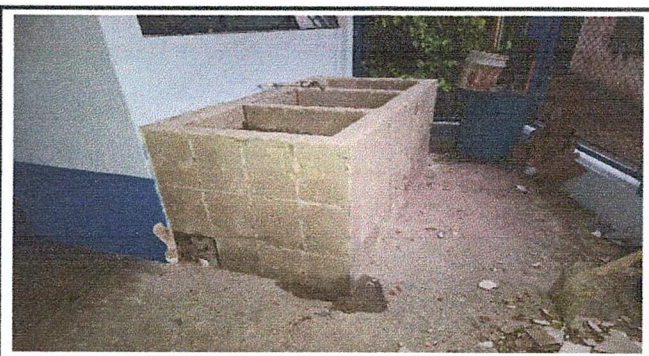


Foto 10: Mantenimiento 10 metros cuadrados de pila de concreto con instalación de azulejos.

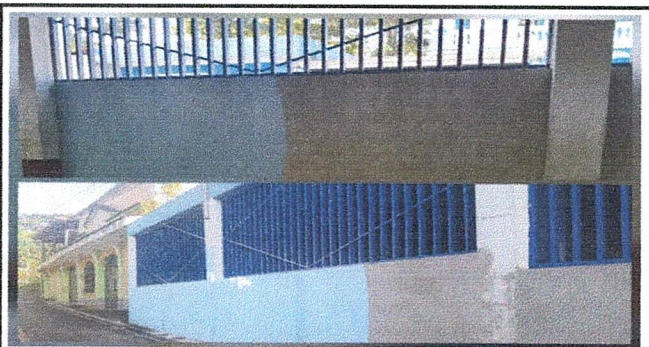



Foto 11: Pintura de 501 metros cuadrados en paredes interiores de aulas y exteriores de salones de clases, pasillos, pared de calle e interior, cancha escolar.



Foto 12: Pintura de 501 metros cuadrados en paredes interiores de aulas y exteriores de salones de clases, pasillos, pared de calle e interior, cancha escolar.


Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

