



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0013-43	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: En la circulación perimetral se realizó zanqueo, fundición de cemento, colocación de block, dejando los postes de tubo galvanizados fundidos desde la cimentación hasta la solera en U



Foto 2: Se colocó la malla tensada dentro de la solera tipo U fijada a la varilla de hierro de 3/8" y hacia la parte posterior al travesaño de tubo de 1 1/2" para la posterior fundición de la solera con la malla adentro.



Foto 3: Se electrosoldó el travesaño en la parte posterior a los tubos de postes que están fundidos desde el cemento y luego se tensó la malla en ambos sentidos.

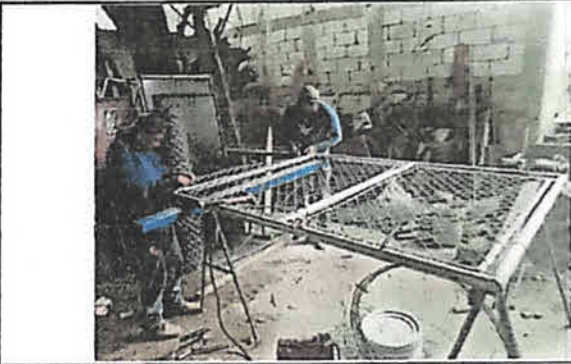


Foto 4: Fabricación del portón de malla de dos hojas abatibles en ambos sentidos con sus pasadores y mecanismo para la colocación de candado en la entrada principal.



Foto 5: Para evitar el derrumbamiento del terreno se construyó el muro de contención con columnas fundidas con concreto y armadura de hierro legitimo.



Foto 6: Después del levantado de block entre las columnas fundidas se continuó con la colocación de la malla galvanizada con sus postes y travesaños superiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

