

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024

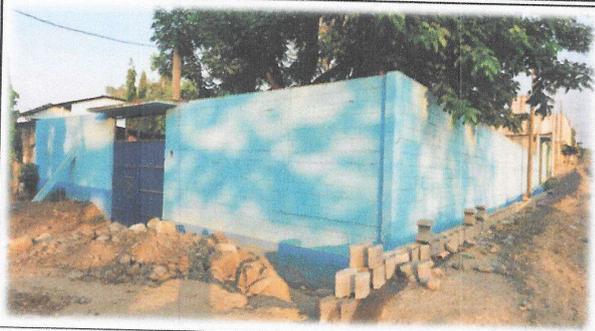


Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, Aida Maria Sandoval Alarcon de Rivers.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento en el 1er módulo de servicios sanitarios por medio del cambio e instalación de inodoros, incleye conexión y kit completo.



Foto 4: Mejoramiento en el 2do módulo de servicios sanitarios por medio del cambio e instalación de inodoros, incleye conexión y kit completo.

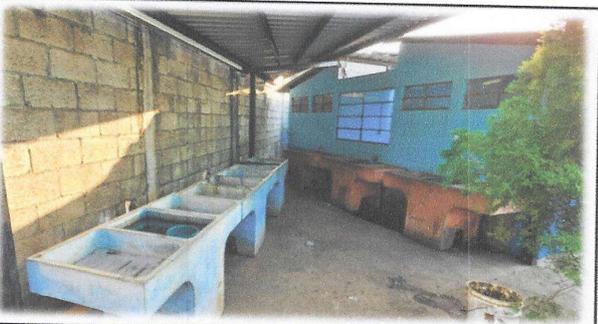


Foto 5: Existe la necesidad del cambio e instalación de pila de dos lavaderos.

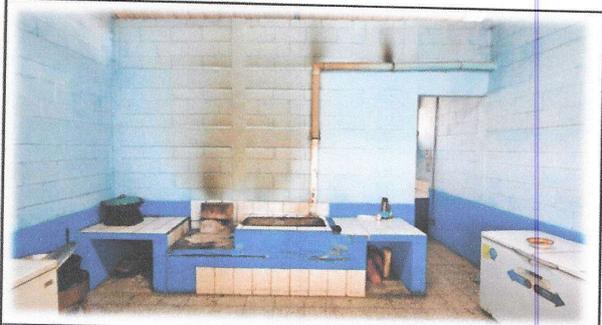



Foto 6: Cambio e Instalación de estufa de leña rural mas chimenea, y azulejo.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 E.O.R.M. AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa	
---	---	---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto7: Directora del establecimiento y Evaluadora de Campo durante la visita de campo en la que se detectan las necesidades prioritarias.



Foto 8: Una de las prioridades en el módulo de aulas es el mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado, aplicación a 2 manos de pintura anticorrosiva).

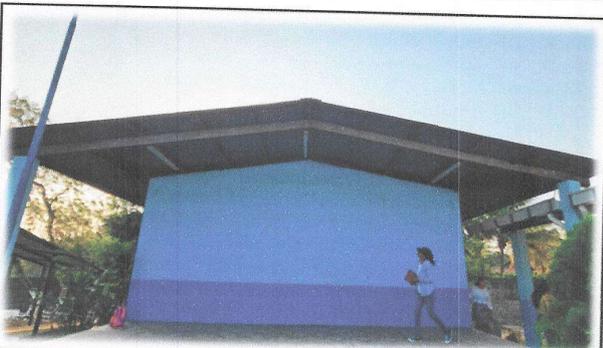


Foto 9: Módulo de aulas a ser intervenido en la estructura de soporte y lámina que se encuentran deterioradas.



Foto 10: Es importante el cambio e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26. (Incluye capote y tornillos)



Foto 11: Reparación de zarán en el área de cancha deportiva, incluye reparación de soporte.



Foto 12: Proceso de medición de trabajos incluidos en las necesidades prioritarias del centro educativo.

Eduardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

