

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEQCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0490-43	FECHA:	21/06/2024



Foto1: Preparación de los agujeros en donde irán las colimnos de concreto que darán soporte al muro de contención.

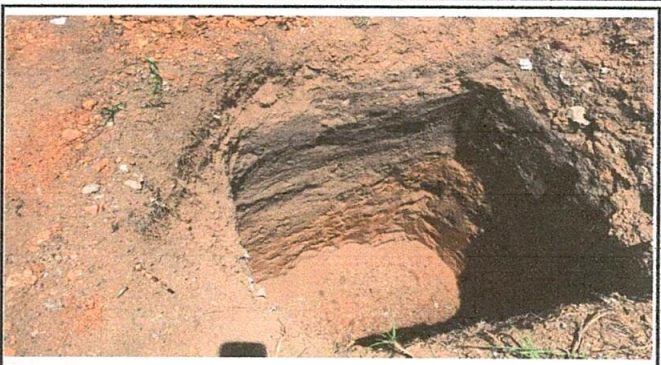


Foto 2: Agujeros listos de dos metros y medio de profundidad por un metro con veinticinco centímetros en cada lado.



Foto 3: Fundición de la base del muro

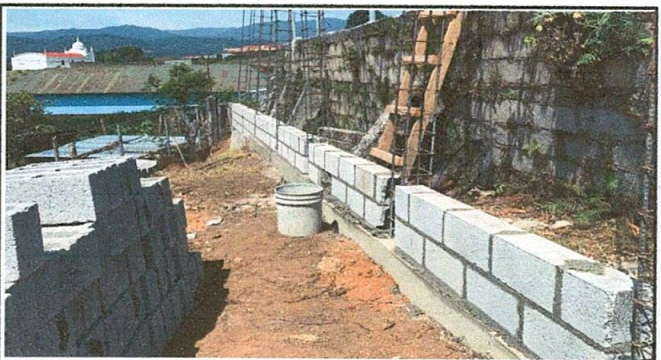


Foto 4: Avance del proyecto del remozamiento 2024

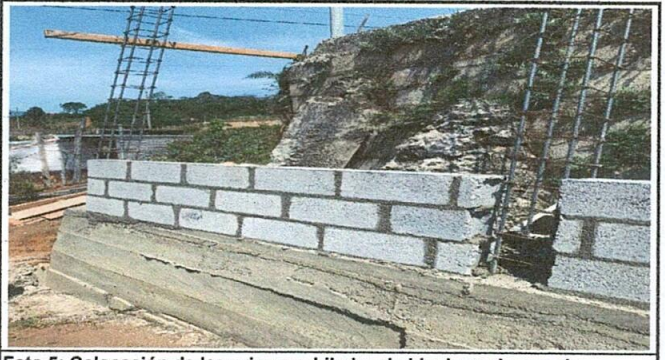


Foto 5: Colocación de las primeras hiladas de block en el muro de contención sobre la fundición de la base de concreto.



Foto 6: Colocación de la segunda solera en el muro para una mayor seguridad del proyecto que se esta ejecutando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

