

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Q'eqchi' Xalalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0090-43	FECHA:	01/07/2024

Sustitución de techo



Foto 1: Desinstalación de láminas existentes, luego limpieza y mantenimiento a estructura de techo. Para la colocación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 del módulo 1 o aula 1.

Mantenimiento a estructura metálica de soporte de techo



Foto 2: Mantenimiento a 175 metros cuadrados a estructura de soporte de metal del módulo 1 o aula 1 con pintura anticorrosiva.

Sustitución de piso de corredor a aula 1



Foto 3: Realizando la limpieza para la sustitución de piso de torta de concreto de corredor del módulo o aula 1.

Suministro e instalación de puertas

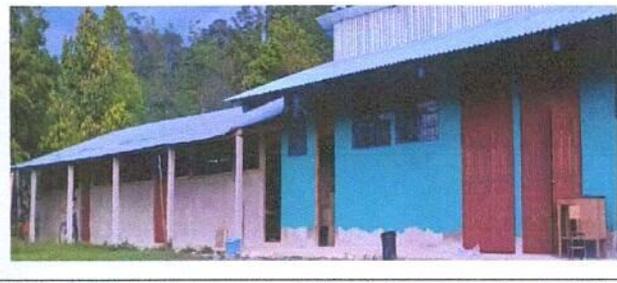


Foto 4: Instalación de dos puertas de doble hojas, puerta en la entrada de la biblioteca y una puerta de la dirección que funcionan en el mismo módulo. También las otras 2 puertas trabajadas con el saldo del presupuesto.

Ventanas y balcones




Foto 5: Fabricación e instalación de ventanas balcón de metal a módulo o aula 1.

Aplicación de repello y pintura



Foto 6: Aplicación de pintura de aceite en muros exteriores; que se adquirieron con los fondos, la aplicación fue parte de la mano de obra de los padres de familia. Esto después de la aplicación de repello gris.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.P.E. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
