



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Concepción Tutuapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Huispache |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0303-43 | FECHA: | 08/10/2024 |



Foto 1: Trabajo terminado en la Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada calibre 26 y Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de piso cerámico de baños terminado y colocado correctamente



Foto 3: Mantenimiento de portón de metal terminado satisfactoriamente



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada, con blok, terminado satisfactoriamente

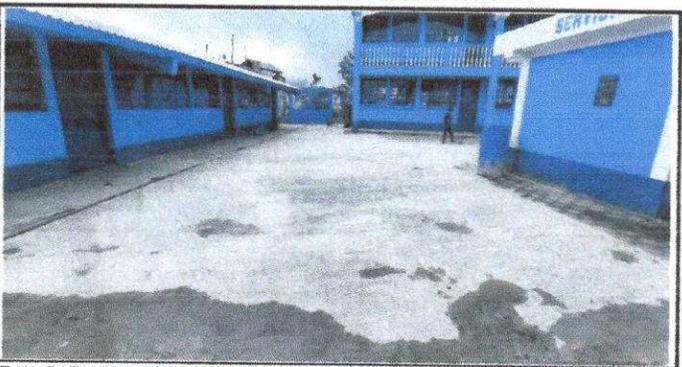


Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio 370m² satisfactoriamente terminado.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras de la pila hasta la línea principal, colocada en una zanja correctamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Rivas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Concepción Tutuapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Huispache |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0303-43 | FECHA: | 08/10/2024 |



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1100 lt. Colocación de depósito de agua marca rotoplas de 1100 litros y accesorios.

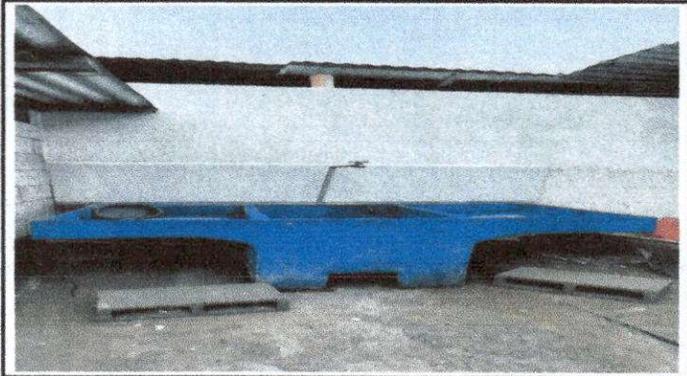


Foto 8: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, con chorro y accesorios instalado correctamente

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando B. B.
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
