

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 853 ALDEA CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 41 SECTOR 1, ALDEA CONTRERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: aplicación de dos manos de pintura en 407.50 metros de pintura dentro y fuera de aulas con zócalo de 0.80 siendo 213.41 metros cuadrados



Foto 2: sustitución de torta de cemento por piso cerámico en 3 aulas, de 7.30 m por 7.81 metros haciendo un total de 171.00 metros cuadrados de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de cerca de malla e instalación de 33.00x 2.40 mts. lineales, con un total de 79.20 m2 de Electromalla con tubo cuadrado a cada 2.50 mts de separación, sobre base de muro perimetral existente, do la parte trasera de la escuela, colocación de 5 hiladas de block sobre muro existente, no se incluye fundición de cimientos ni columnas)



Foto 4: Instalación de malla , 40.00x 2.40 mts. lineales, con un total de 96.00 m2 de Electromalla con tubo cuadrado a cada 2.50 mts de separación, sobre base de muro perimetral existente).

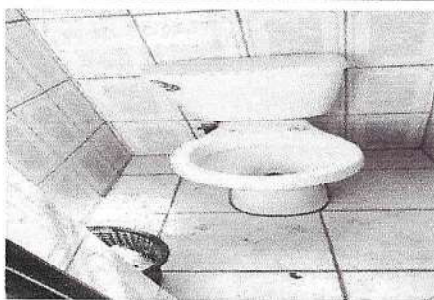


Foto 5: Sustitución de 3 servicios sanitarios y accesorios, por ser antiguos no se encuentran respuestos para las fugas que tienen



Foto 6: sustitución accesorios de lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPE



Guillermo Guzmán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 853 ALDEA CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 41 SECTOR 1, ALDEA CONTRERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Instalación de tubería nueva, desde acometida a tinaco nuevo y de tinaco hacia área de cocina (uno de los tinacos es prestado)

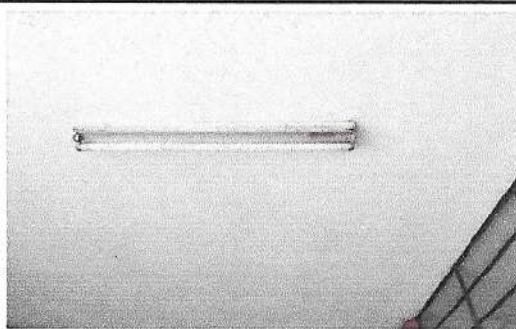


Foto 8: sustitución de tubos led 48" 18W



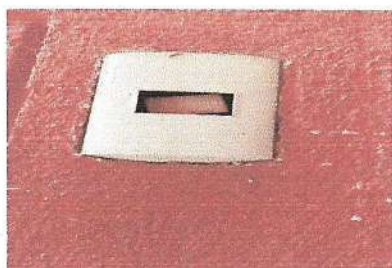


Foto 9: sustitución de apagadores en el primer y segundo nivel

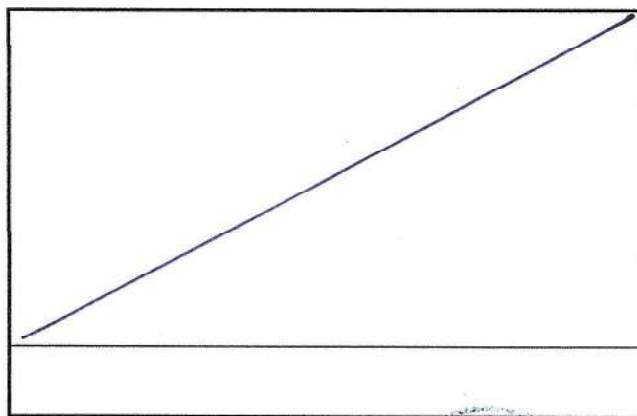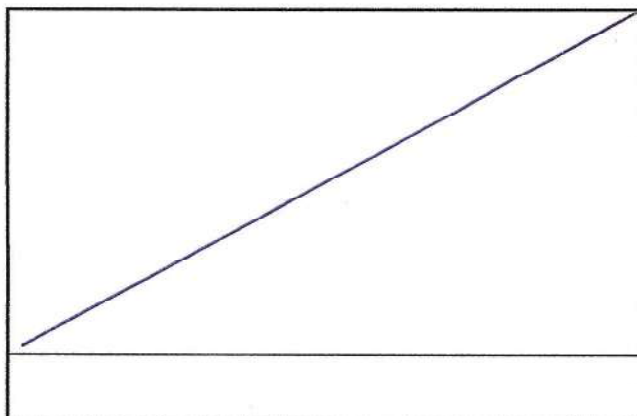

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marleny Pineda</i> Firma y sello del Presidente de la OBF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--
