

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.No 775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1331-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Se tiene previsto sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en area de ingreso



Foto 2: Se tiene previsto sustitución de canales y bajada de agua pluvial del area de ingreso.



Foto 3: Se tiene previsto sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en area del corredor de ingreso

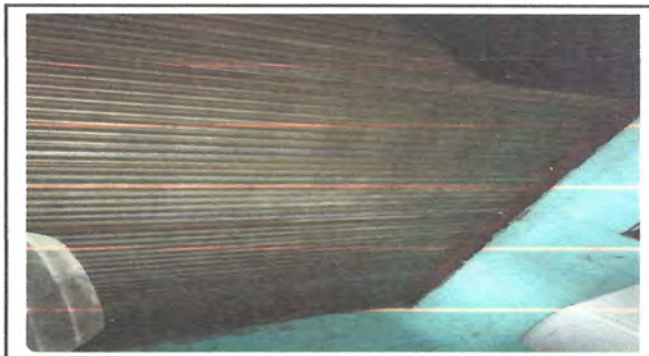


Foto 4: se tiene previsto cambio de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en bodega de cocina



Foto 5: se tiene previsto sustitución de piso de torta en area del corredor

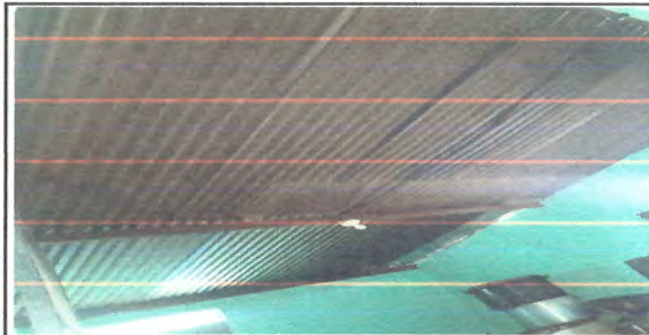


Foto 6: se tiene previsto cambio de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Marmón Posa
Firma y sello del Presidente de la OPR



Mayra Guzmán
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.No. 775	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1339-43	FECHA:	2/06/2025



Foto7: Se tiene previsto sustitución piso de granito en aula de párvulos



Foto 8: se tiene previsto sustitución de piso de granito en aula de tercero primaria



Foto 9: Se tiene previsto sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en aula de tercero primaria



Foto 10: se tiene previsto cambio de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en aula de párvulos

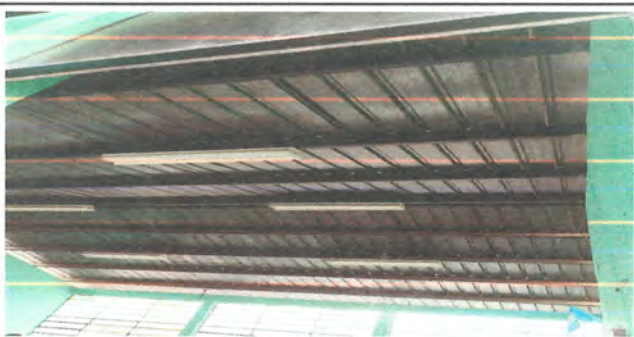


Foto 11: se tiene previsto cambio de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en aula de segundo primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

