

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nanzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0492-43	FECHA:	03/06/2025



Foto 1: Lámina de cocina en mal estado a sustituir con lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Estructura de soporte de madera en mal estado para sustituirla con estructura metálica galvanizada en cocina.

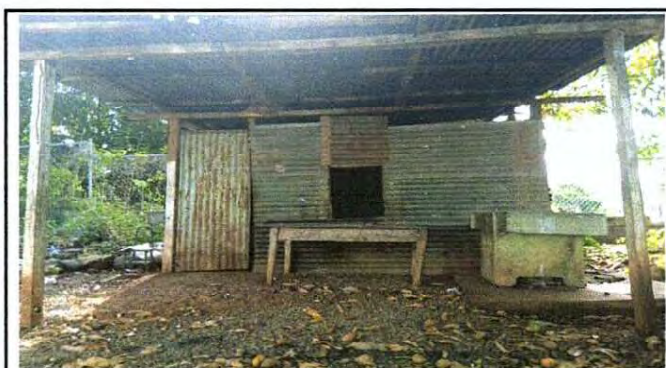


Foto 3: Piso de torta de concreto en mal estado en área interna y externa de cocina a mejorar con piso de cerámico en área interna y torta de concreto en área frontal.



Foto 4: Piso de torta de cemento en mal estado a mejorar con piso cerámico en área interna de cocina (previa nivelación con torta de concreto)

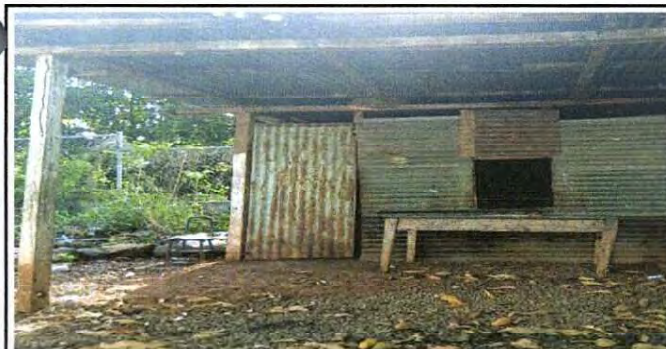


Foto 5: Área de instalación de puerta metálica de 1 x2 metros en cocina

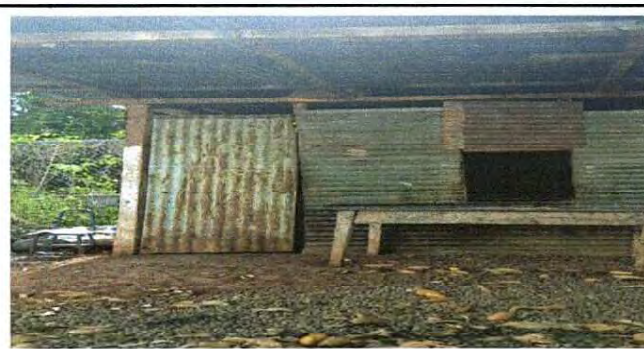


Foto 6: Área de instalación de chapa de metal marca Yale en puerta metálica que se instalará en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nanzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0492-43	FECHA:	03/06/2025



Foto 7: Area de cocina para instalación de ventanas metálicas de 1x1 metro con pasadores de seguridad.



Foto 8: Base provisional para tinaco de captación de agua a sustituir por torre de estructura metálica de 2x 1.50 metros con tubo galvanizado.



Foto 9: Area de cocina para ampliación con paredes de block y pilares de concreto.



Foto 10: Estufa rural de barro deteriorada a sustituir por polletón de block y concreto en cocina (incluyendo plancha metálica y chimenea)



Foto 11: Pila de cemento dañada de tanque de almacenaje. Se instalará pila prefabricada de dos lavaderos en área externa de cocina




Foto 12: Area de Instalación de tubería para evacuación de aguas residuales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

