

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSELITA ALLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 1A. AVE. 1A-24 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	29/09/2025



Mantenimiento correctivo de pasillo (nivelación y compactación) de suelo previo a la colocación de torta de concreto en módulo 2



Sustitución de piso granito a plancha de concreto con e=0.10 mts en area de pasillo módulo 2 y área recreativa en módulo 1

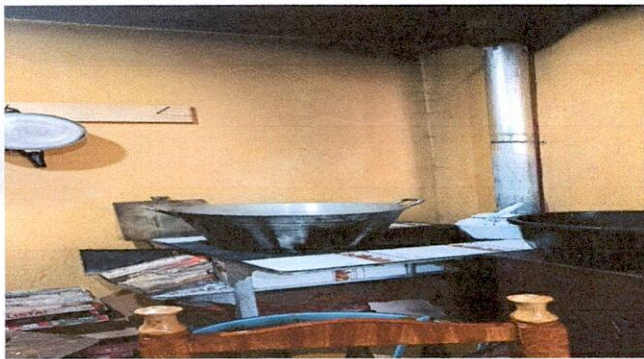

Sustitución de plancha ahorradora a plancha de 1.30 mts x 1.00 mts y 0.90 mts de alto, de concreto y ladrillo, con chimenea de tubo de concreto, en cocina del módulo 2



Sustitución de mesa de trabajo en cocina de módulo 2 (4.80 mts X 0.60 mts y 0.90 mts de alto) incluye azulejo



Mantenimiento correctivo a piso en cocina módulo 2 con torta de concreto e=0.05 mts previo a la colocación de piso cerámico



Suministro e Instalación de piso cerámico (0.33 mts X 0.33 mts) en cocina módulo 2 y direccion del módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSELITA ALLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 1A. AVE. 1A-24 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	29/09/2025

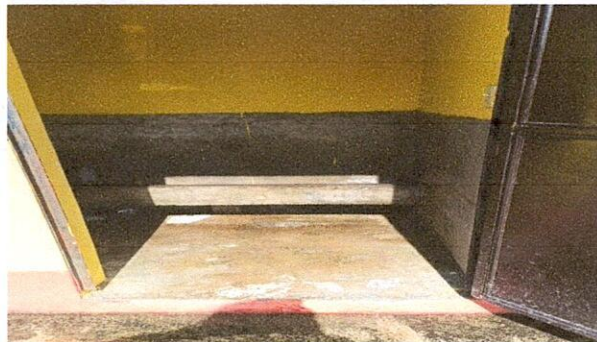

Suministro e Instalación de azulejo en mingitorio baño de hombres módulo



Sustitución de division por durock (3.60 mts X 2.60 mts) usg 1/2X4X8 y pintura en direccion del módulo 1



Sustitución de puerta de metal por puerta de metal en cocina módulo 2, (2.30 mts X 1.00 mts)



Sustitución de puerta (2.00 mts X 1.00 mts) de metal en direccion del módulo 1



Sustitución de accesorios de tanque de inodoro en baños del modulo 1 (válvula de llenado, flaper de caucho, flotador de tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

