

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA BUENA VISTA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0016-43	FECHA:	25/09/2025

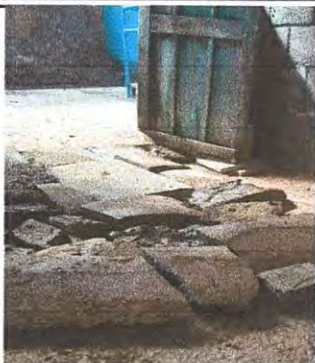

Mantenimiento correctivo de planchas de concreto con instalación de piso granito en comedor escolar.



Sustitución piso de concreto por piso de concreto 10 Cms de Espesor en acceso a baños módulo 1



Reparación de repello y cernido en muros interiores y exteriores área de comedor modulo 1



Reparación de cernido en columnas área de comedor módulo 1



Sustitución de ventana de madera por ventana de vidrio 5m. con tee de ¾ en área de comedor módulo 1



Sustitución planchas de piso cemento por piso vinil en aula módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA BUENA VISTA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0016-43	FECHA:	25/09/2025

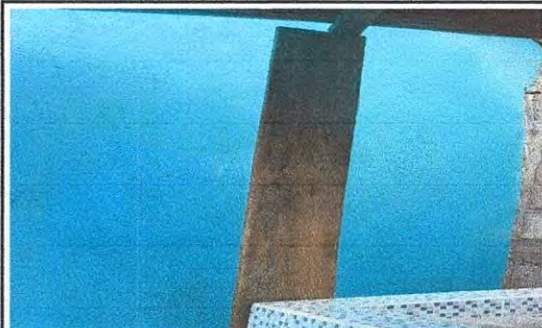

Sustitucion de estructura portante de madera por estructura portante de metal para techo de pila módulo 1. incluye pintura fas dray color azul secado rápido



Sustitución de lámina, por lamina troquelada 0.38 calibre 26 en techo de madera en pila modulo 1.



Sustitución de balcón de metal por balcón de metal. Tubo Cuadrado de ¾ chapa 18" en área de comedor módulo 1



Mantenimiento de muros con aplicación de pintura corona clásica de aceite color celeste en muros exteriores del salón y muros interiores y exteriores del área de comedor módulo 1



Mantenimiento en puertas de metal con pintura de Aceite Fas Dray Secado Rápido módulo 2 (incluye limpieza y lijado)



Sustitución de puerta de madera por puerta de metal lámina 3/64 chapa yale área de comedor módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

