



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LOMA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0424-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Sustitución de 16 Mts. de manejo de agua pluvial existente con tubo PVC. de 4" por manejo de agua pluvial con canal U de concreto y regla de metal en el módulo 1



Foto 2: Sustitución de 22 Mts. de canal de PVC. Por canal de metal en módulo 1



Foto 3: Mantenimiento a 1 migitorio con azulejo en baño, módulo 1



Foto 4: Mantenimiento correctivo de 86 Mts. Cuadrados de losa de concreto con nivelación de terraza para aplicación de Impermeabilizante (relleno de grietas y desnivel) en módulo 2



Foto 5: Mantenimiento correctivo de 86 Mts. Cuadrados de losa con impermeabilizante con bloqueador de agua aqualock 10 años, en 1 aula del módulo 2



Foto 6: Sustitución de 1 deposito de agua 2500 lts. más instalación en módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROCESO 123
Versión 4

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	MUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-15-0424-43	FECHA	21/07/2023

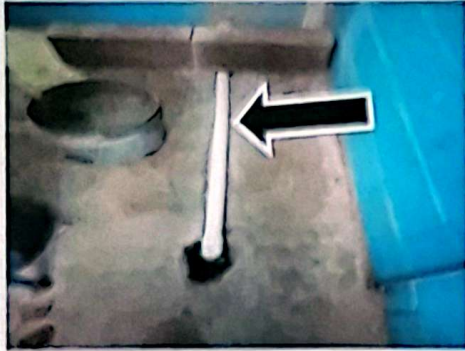


Foto 7: Instalación de 6 mts. de tubería PVC, Línea principal para migitorio 4" con recubrimiento de concreto en módulo 1



Foto 8: Sustitución de 1 pila en cocina en módulo 2



Foto 9: Sustitución de 1 inodoro elongado en módulo 1



Foto 10: Sustitución de 1 puerta de bodega de madera por 1 puerta metálica en módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

