

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María de Jesús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0001-45	FECHA:	16/12/2025



REGLÓN 1. Mantenimiento y sustitución de estructura en el Segundo Nivel con tubos de 4X4 y costaneras de 2X3. 54 mts2



REGLÓN 2. Mantenimiento y sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en el segundo nivel. 54 mts2



REGLÓN 3. Mantenimiento y sustitución de lámina troquelada calibre 26 sobre rampa. 46 mts2



REGLÓN 4. Suministro y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores en losa. 920 mts2



REGLÓN 5. Mantenimiento y aplicación de pintura en puertas interiores y exteriores (lijado, pintura). 15 puertas



REGLÓN 6. Mantenimiento y aplicación de pintura en balcones interiores y exteriores. 39 mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María de Jesús
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0001-45	FECHA:	16/12/2025




REGLÓN 7. Mantenimiento y aplicación de pintura en barandales, pasamanos de rampa y segundo nivel. 40 mts lineales




REGLÓN 8. Mantenimiento y sustitución de canal de agua pluvial y tubo de PVC de 4 pulgadas 16 ml. Primer nivel.

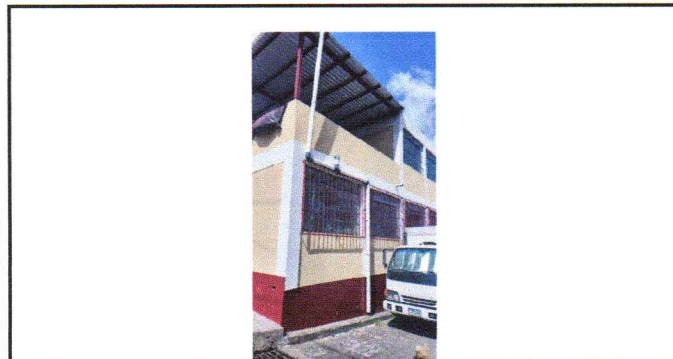


REGLÓN 9. Mantenimiento y sustitución de tubos en bajadas de agua pluvial PVC de 4 pulgadas (accesorios y abrazaderas). 16 mts lineales

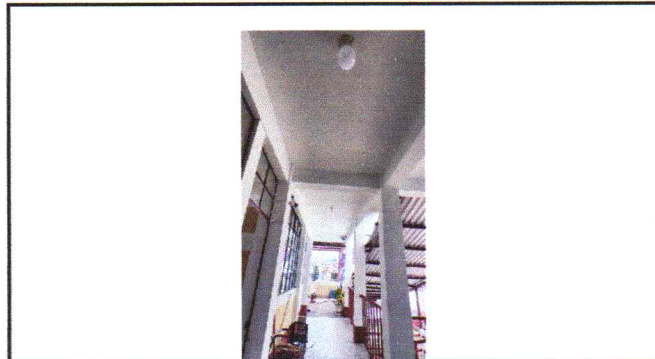

REGLÓN 10. Mantenimiento correctivo del sistema de iluminación por focos ahorrativos en: Aulas, corredores del primer y segundo nivel. 36 focos.

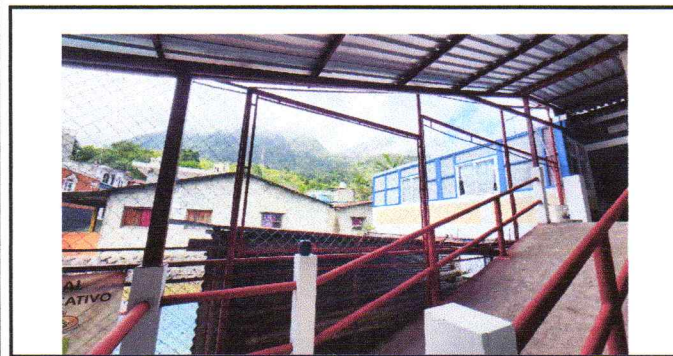


REGLÓN 11. Mantenimiento y sustitución de malla a un costado de rampa. 27 mts²

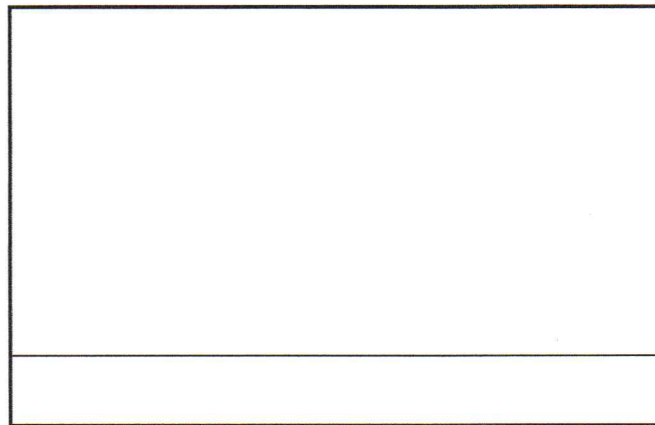

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
