

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0009-43	FECHA:	1/10/2025

 Sustitución estructura metálica de soporte del techo 36 m2 y Sustitución estructura metálica soporte de paredes 24 ml	 Sustitución de lámina troquelada por lámina acanalada calibre 26 en módulo 1. 60 m2
 Mantenimiento y sustitución de repello de paredes exterior módulo 1. 80 m2	 Sustitución de red eléctrica Módulo 1 40 ml, Sustitución de Cable 10AWG para red eléctrica modulo 1 y S.S. 80 ml, Mantenimiento correctivo con forro Industrial de aislamiento para red eléctrica 40 ml, Sustitución de lámparas de techo para sobreponer tipo led en modulo 1 y S.S 5 unidades
 Mantenimiento y sustitución de piso cerámico para módulo 1, 36 m2	 Sustitución de puerta principal Modulo 1, 1 unidad; Sustitución de ventanas a PVC corredizas modulo 1 de 1.04x1.75 metros 2 unidades; Sustitución de balcones metálicos módulo 1 de 1.04 x 1.75 metros 2 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0009-43	FECHA:	1/10/2025




Sustitución de sanitarios de un solo cuerpo doble descarga 2 unidades; Sustitución de puertas para servicio sanitario de doble seguro 2 unidades; Sustitución de piso de cemento a cerámico en servicios sanitarios 6 m2; Mantenimiento de paredes de servicios sanitarios repello y pintura 32m2; Instalación de cielo falso con iluminarias de servicios sanitarios 2 unidades



Sustitución de puertas para servicio sanitario de doble seguro 2 unidades



Sustitución de piso de cemento a cerámico en servicios sanitarios 6 m2; Mantenimiento de paredes de servicios sanitarios repello y pintura 32m2; Instalación de cielo falso con iluminarias de servicios sanitarios 2 unidades

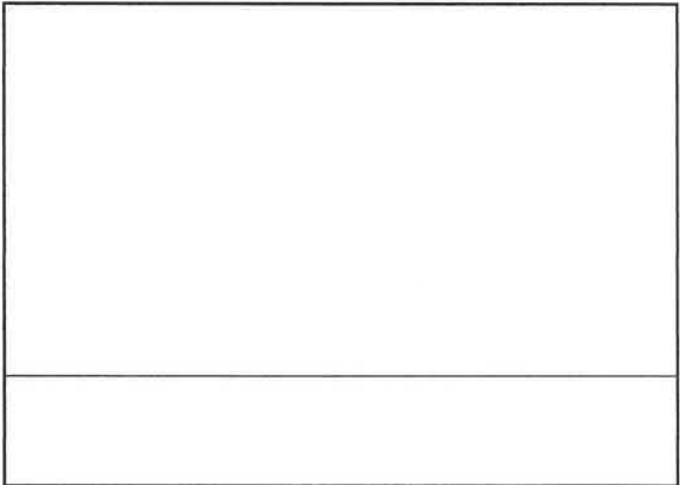

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---
