

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4137-45	FECHA:	8/11/2025



Sustitucioin de lamina acanalada por lamina troquelada 26.46 m2



Sustitución de estructura portante de techo por estructura de metal 46 m2



Reparación de muro con zapata 0.80 x 0.80x 0.20 M. Hierro de 1/2". 8 unidades



Reparacion de muro con columnas 0.20 x 0.20 x 4.0 M. Hierro de 1/2" y estribos 3/8". 8 unidades	
---	--



Reparación de muro con viga de 0.25 x 0.30 con varillas de 1/2 y estribos de 3/8". 28.2 m2



Sustitución de puerta de madera por puerta de metal. 1 Unidad. Medidas 1 x 2.05 con chapa Yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zout

Firma y sello del Presidente

Pring

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4137-45	FECHA:	8/11/2025





SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE UPVC CORREDIZA 3 UNIDADES



Reparación de sistema eléctrico cableado calibre 10 AWG, Sustitución apagadores dobles, 3 unidades y Sustitución tomacorrientes dobles, 6 unidades

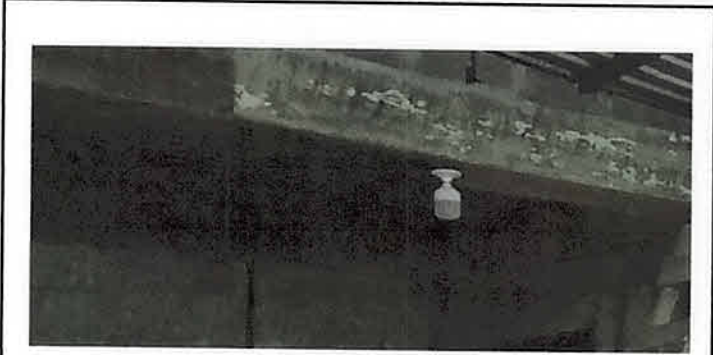

SUSTITUCION DE BOMBILLOS LED DE 40 WATTS, 6 UNIDADES

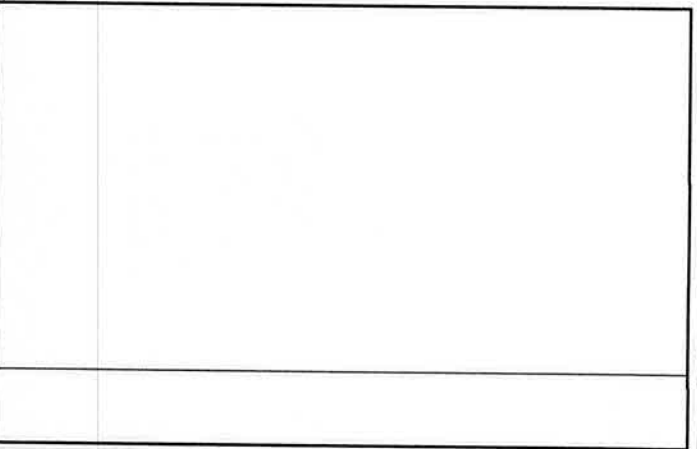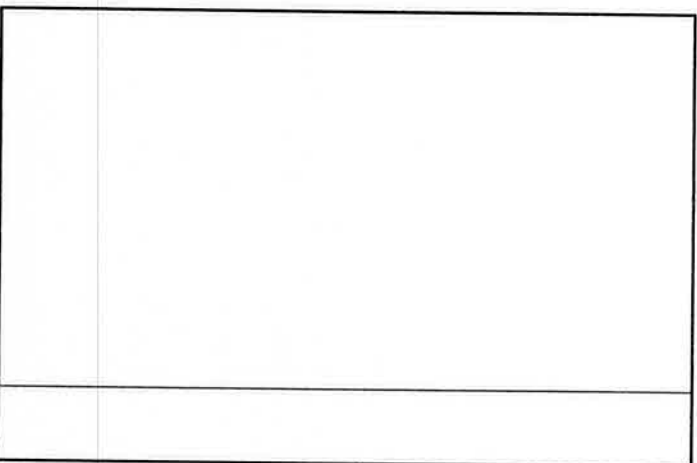

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---
