



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0434-42	FECHA:	30/04/2025




Numerales 1.1, 1.2, 1.3 Sustitucion de Chapa y Mantenimiento de estructura.



Numerales 1.4, 1.5 Ventanas y Balcones, Mantenimiento a Estructura (2 aulas, y cocina.




Numeral 1.5 y 1.6 Estructura portante y lamina para Tapasol.

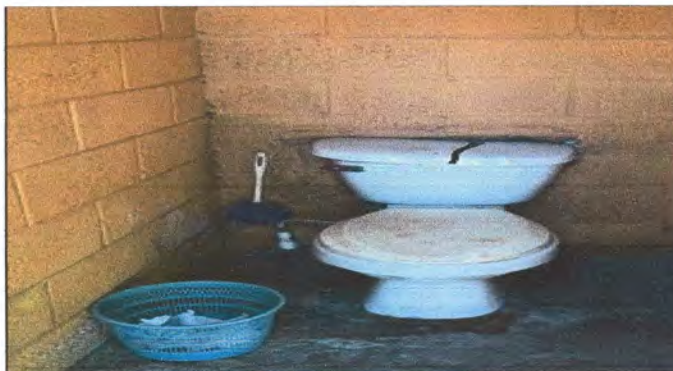

Numeral 2.1 Sustitucion de Inodoros en mal estado, llave de paso, tubo de abastecimiento e inodoro y tanque completo con accesorios



Numeral 2.2 Reparacion de Piso de Concreto (Se puede Observar el estado en el que se encuentran, se ven la armadura de losa) (Numeral 2.3 al reparar la losa de piso se colocara piso Ceramico)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludvin Masila Cordon Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0434-42	FECHA:	30/04/2025



Numeral 2.4 Quitar taponamiento en drenaje de pila, esta tapado. Numeral 2.5 Instalar llave de Chorro. Numeral 2.6 Sustitucion de Losa de Pila (Existente Quebrada) 2.7 Azulejo p/Pila

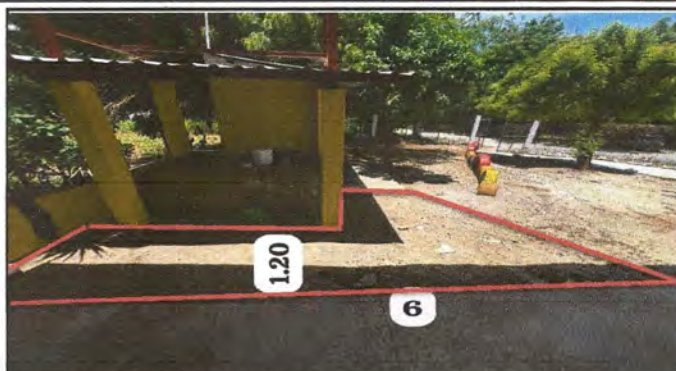

Numeral 2.8 Fundicion de Losa de Concreto frente a pila (Se Produce Lodo) (Linea hace referencia al area total que se pretende Remozar)




Numeral 3.1 Fundicion de Losa de Concreto a la par de salon de parvulos, se produce lodo (Lineas hacen referencia)



Numeral 3.2 Banquetas hundidas. Ampliacion de Banqueta de concreto a un lateral del establecimiento. AUMENTO DE DIMENSIONES (7.8M DE LARGO, 0.6 DE ANCHO, 0.2 DE ALTO sobre nivel de piso de tierra)



Numeral 4 Reparacion de agujeros en Muro de malla galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludvin Masilú Córdón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LLANO DE PIEDRAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE PIEDRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0434-42	FECHA:	30/04/2025

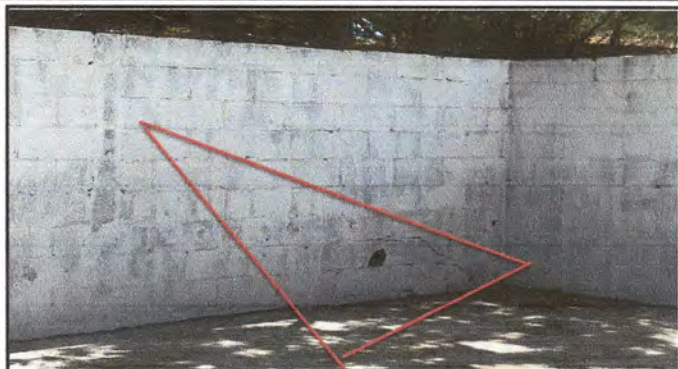

Numeral 4.2 Muro en mal estado (el muro se rompió debido a empuje producido por un árbol, Se pretende derribar esa parte mala, retirar el "árbol" y volver hacer de nuevo con cemento, vigas y columnas)

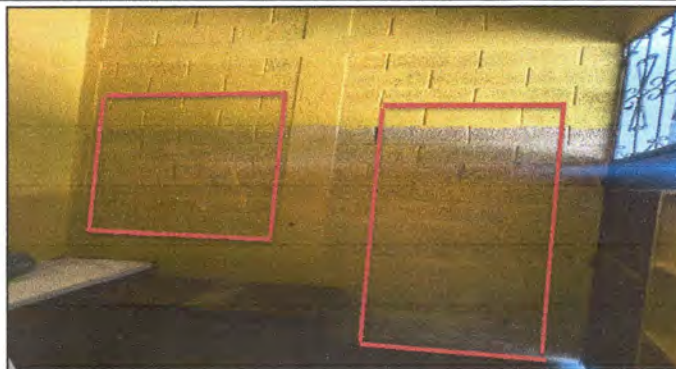

Numeral 5.1 Apertura de Ventana en pared de cocina para unir 2 ambientes, Recuadro hace referencia. Ventana de 1M2 y Puerta de 2.1M2



Numeral 5.2 Marquesinas de Concreto con Azulejo, para colocar Hoyas, Platos, Cubiertos, en General lo que se necesite en cocina. (Linea hace referencia, sera en ambos ambientes)



Numeral 6 Suministro e Instalacion de Canal de Lamina Lisa Aluzinc, Calibre 26 + Pescantes de Hierro (Como se puede observar, canal de pvc esta aguado y los pescantes estan oxidados)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ludvin Marilú Cordón

Firma y sello del Presidente de la OPF



Claudio J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

