

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral PAIN aldea el maguey	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Maguey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0887-42	FECHA:	28/04/2025



Numeral 3.6 y 3.7 Ventiladores Giratorios Para Cocina y Aula (2 en cocina, 1 extra en 1 aula) y sus instalaciones electricas para abastecimiento de energia.



Numeral 4 (4.1) Inodoros en mal estado (Estan agrietados por la parte de atrás, se trataron de arreglar con porcelana pero no funciona, y estan mal instalados porque suelta demasiado mal olor y esta cerca de la cocina.



Numeral 4.2 Suministro e Instalacion de Deposito de Agua, en estructura existente de torre de tinaco.



Numeral 4.3 Demoler losa de Pozo de Absorcion y Reponerla. (Losa esta quebrada, salen malos olores, y presenta hundimiento pegada al tapial. (No esta fundida con tapial)




Numeral 5.1 Mantenimiento a Puerta de Ingreso a establecimiento.



Numeral 5.2 Suministro e Instalacion de Puerta de Metal de tipo reja para evitar que los niños suban a la rampa y con consiguiente lleguen a la puerta de Ingreso sin Supervision de docente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral PAIN aldea el maguey	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Maguey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0887-42	FECHA:	28/04/2025




Numeral 1: Pintura en mal estado, (Aplicación de Impermabilizante, y Zocalo a una altura de 0.60m)




Numeral 2.1 Sustitucion de chapa en mal estado.

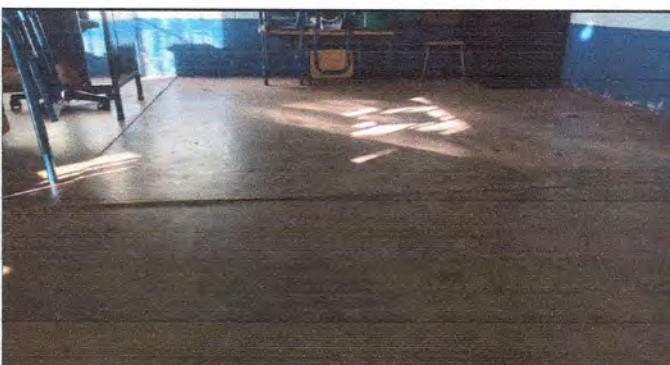

Numeral 2.2 Sustitución de Piso de Cemento Liquido, esta desanivelado (Levantado en una esquina y Hundido en el Opuesto)

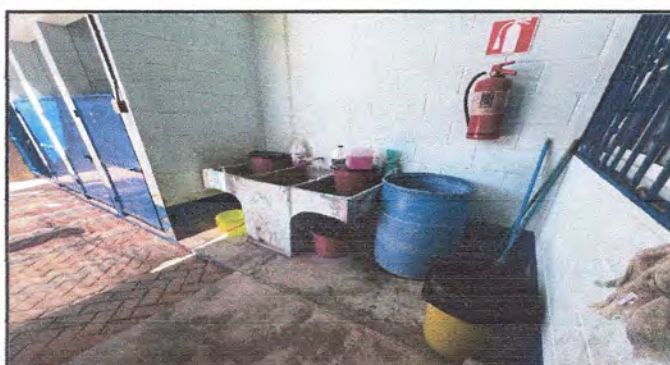

Numeral 3.1 Pila de 2*1 de 2 lavaderos. (pila existente prefabricada, sera sustituida por una fabricada con mano de obra)

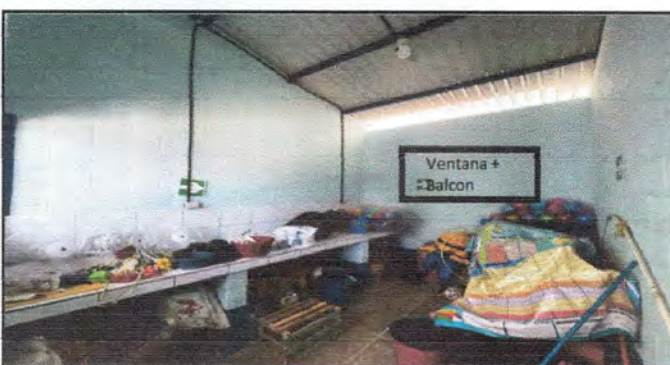

Numeral 3.2, 3.3 y 3.4 (Demolicion en pared, ventana de pvc y balcon metalico)



Numeral 3.5 Suministro e Instalacion de Puertas Dobles de PVC en Gabinete Existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jenifer Esteli Ladino Suck

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

