

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



2.5 pintura en muros exteriores e interiores

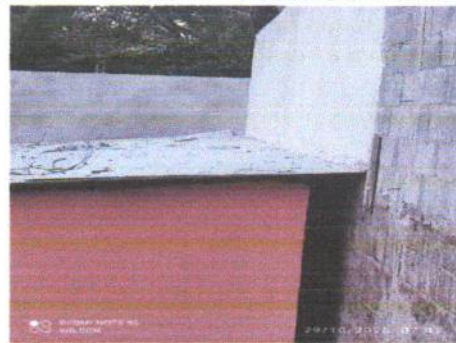


Foto 2.6 Instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 28 para evitar filtracion de agua en aula.



foto 2.7 mantninito a balcones limpia y pintura



Foto 2.8 mantenimiento a puerta limpieza y pintura



2. Aula 2.9 fundir rampa de acceso a aula para mayor seguridad de los estudiantes.



2.10 instalación de energia electrica, 2 tomacorriente, 2 bombillas led 1 apagadores ya que no esta en las condiciones adecuadas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



Foto 4.6 sustrucción de pila de concreto por pila plastica esta muy deteriorada



foto 5. Drenaje 5.1 Instalacion de tubería para drenaje el que esta presta deteriorado



foto 6. 1 Muro perimetral 6.1 mejoramiento en repello en muro



Foto 6.2. mejoramiento con cernido en muros



foto 6. 1 Muro perimetral 6.1 mejoramiento en repello en muro

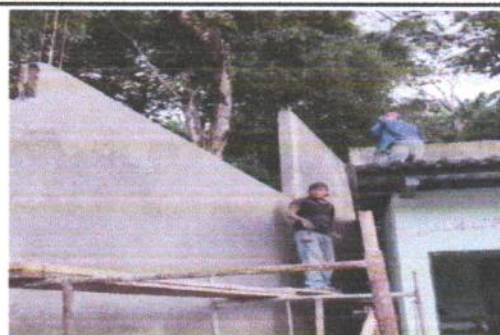


Foto 6.2. mejoramiento con cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1132-42	FECHA:	27/10/2025



Foto1: 1.1 sustitución de de tinaco 1,000lts por tinaco de 1,100lts accesorios y suministros



Foto 1. 1.1 .S ustitución de de tinaco 1,000lts por tinaco de 1,100lts accesorios y suministros



Foto 2 aula 2.1: instalar piso ceramico con adhesivo piso sobre piso.



Foto 2.2 instalar ventanas corredizas PVC



2.3 Instalación de fachaletas en pared exterior para evitar humedad.



2.4 Instalación de azulejos en interior de aula para mayor durabilidad de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

