



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisanik
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-7322-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 7: Cambio de espacio del tinaco del espacio libre a la cocina. MODULO 2.



Foto 8: Complemento de la banqueta enfrente de la cocina de torta de cemento. MODULO 2.



Foto 9: MODULO 2. Sustitución de madera a block en el mojinete y costaneras de madera a metal.




Foto 10: MODULO 2. Repello mas cernido de la pared de la cocina.



Foto 11: MODULO 2. Sustitución de lámina de zinc a lámina troquelada calibre 26 de la cocina.



Foto 12: MODULO 1. Vista física de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Chisanik actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalía Chén Tz'it

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rosario

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisanik
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-7322-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: Cambio de madera a block del mojinete y repello de la cocina. Módulo 2.



Foto 2: Sustitución de lámina a lámina troquelada. Módulo 2.



Foto 3: Sustitución piso de torta cemento a piso cerámico, aula No.1. MODULO 1.

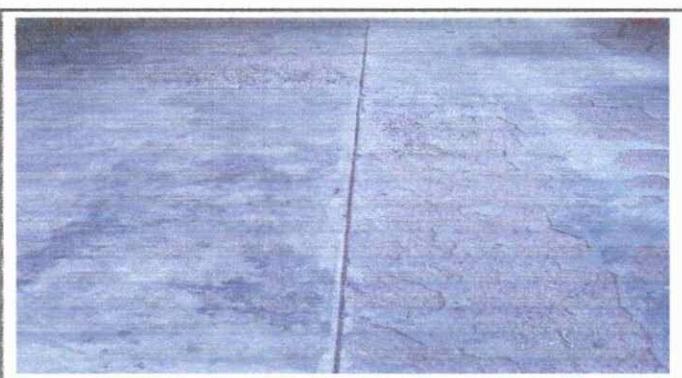


Foto 4: Sustitución de piso de torta cemento a piso cerámico, aula No. 2. MODULO 1.

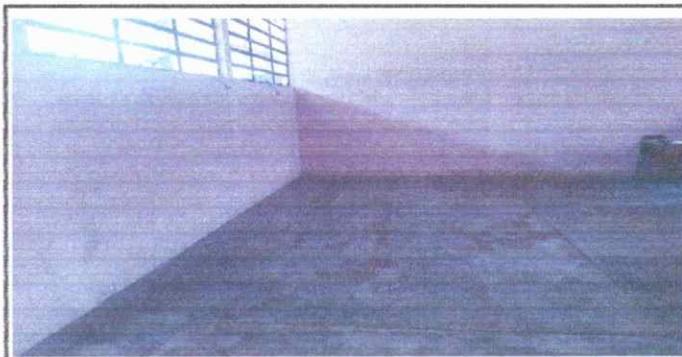


Foto 5: Sustitución de piso de torta cemento a piso cerámico, aula No.1. MODULO 1. Se observa las paredes del aula.



Foto 6: Sustitución de piso de torta cemento a piso cerámico, aula No. 2. MODULO 1. Se observa las paredes del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rosendo
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

