

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.1720 Aldea El Sombrerito, San José Pinula.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sombrerito, sector 1 Lote 25 San José pinula, Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03 1290-43	FECHA:	14/02/2025



Foto 1: REMPLAZO DE FOCOS. (Sustitución de focos en pasillo y cocina, por deterioro.)



Foto 2: REMPLAZO DE PILA. (Sustitución pila de 2 lavaderos. Cambio de pila por deterioro de la existente.)



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA. (Sustitución de 10 láminas de 10 pies, sustitución de capo de 8 pies, reparación general por goteras, se aplicará sellador asfáltico y tela de refuerzo.)



Foto 4: REPARACIÓN LAVAMANOS. (Sustitución de drenaje tipo cifón, ajuste de grifo en 3 lavamanos.)

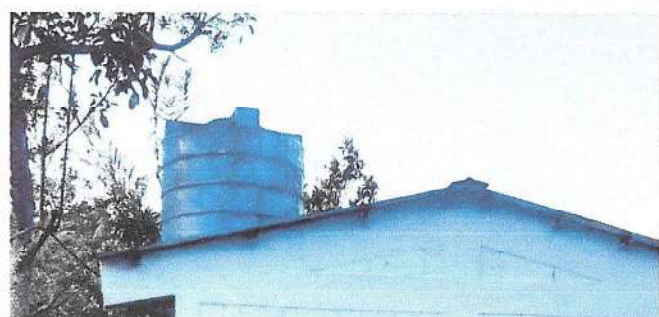


Foto 5: CISTERNA (Sustitución de cisterna de agua potable 1100 litros, remplazo de cisterna por deterioro del existente.)

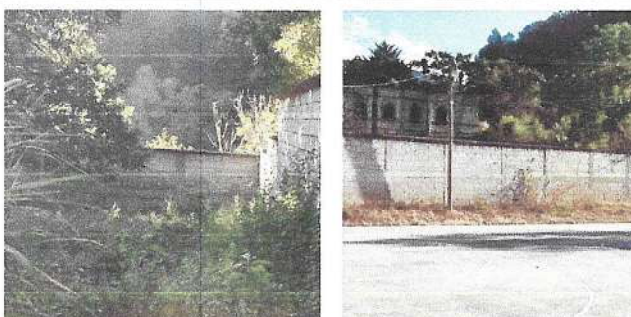


Foto 6: PROTECCIÓN PERIMETRAL. (Colocación de protección perimetral 150 metros lineales. Se instalará raso y dos líneas de alambre espinado.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.1720 Aldea El Sombrerito, San José Pinula.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sombrerito, sector 1 Lote 25 San José pinula, Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03 1290-43	FECHA:	14/02/2025



Foto 1: PISO. (Instalación de piso cerámico 203m2, áreas de colocación: aulas, cocina, servicios sanitarios, en el área de servicio sanitario se instalará piso antideslizante. Las áreas descritas no tienen piso cerámico.)



Foto 2: PISO. (Instalación de piso cerámico 203m2, áreas de colocación: aulas, cocina, servicios sanitarios, en el área de servicio sanitario se instalará piso antideslizante. Las áreas descritas no tienen piso cerámico.)

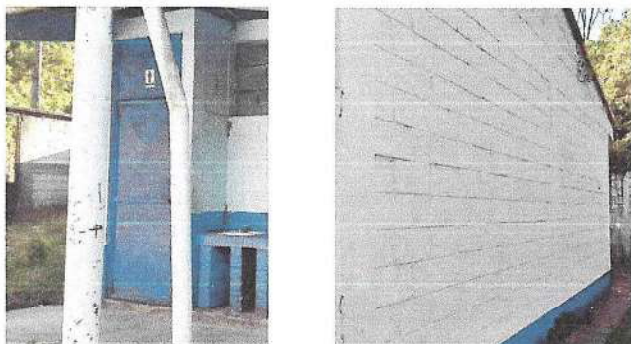


Foto 3: PINTURA. (áreas de salones, cocina, servicios sanitarios y muro perimetral, puertas metálicas, porton y porterías. Se aplicará 1115 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura en las áreas descritas.)



Foto 4: PINTURA. (áreas de salones, cocina, servicios sanitarios y muro perimetral, puertas metálicas, porton y porterías. Se aplicará 1115 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura en las áreas descritas.)



Foto 5: PINTURA. (áreas de salones, cocina, servicios sanitarios y muro perimetral, puertas metálicas, porton y porterías. Se aplicará 1115 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura en las áreas descritas.)



Foto 6: REPARACIÓN PUERTA Y PORTON. (Reparación puerta metálica y porton de ingreso principal, sustitución de candados por deterioro.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

