Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0412-41	FECHA:	6/10/2025

Foto1: Cubierta de laminas y estructura de techo: Se colocara la estructura y cubierta de laminas porque no existe en esta construccion de cocina para poderla culminar ya que el año pasado se habia iniciado.

Foto 2: Levantado de Blocks , fundicion de columnas y cernido en muro interior y exterior de dicha cocina, ya que el año pasado quedo inconcluso.

Foto 3:Ventanas y Puerta; se colocará 4 ventanas , 4 balcones y una puerta principal ya que no existen

Foto 4: Puerta: Se cambiara puerta principal de salon de reuniones de padres de familia ya que el que existe no esta en buenas condiciones ya que es de madera.

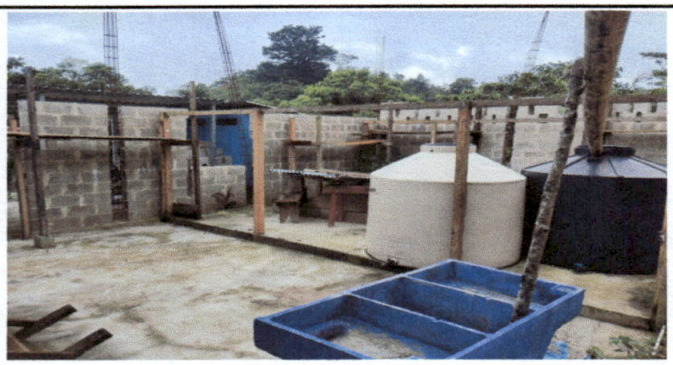

Foto 5: Torta de Piso y Piso Ceramico; En esta area que mide 9.60m x 9.20m se echará nueva torta y se colocara piso ceramico, porque la torta que existe esta quebrada y no esta apta para pegarle ceramico.

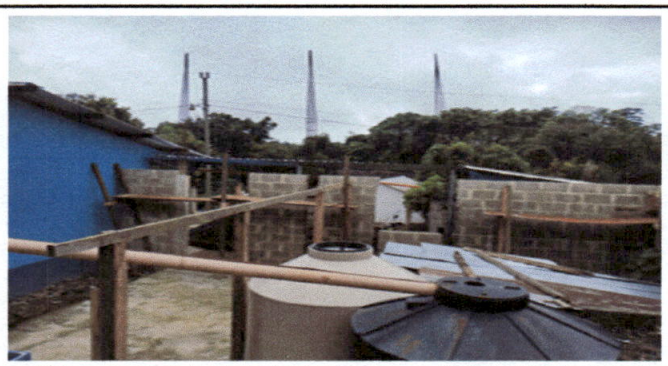

Foto 6: Sistema Eléctrico; Se le colocara el sistema electrico adecuado en esta area de cocina ya que no cuenta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0412-41	FECHA:	6/10/2025

Foto 7: Muro perimetral; Se levantará cuatro filas de blocks de altura luego se colocará electromalla sostenida con tubo de 3x3 cuadrado, Tambien se va a continuar el corredor con techo de lamina encima de los baños.

Foto 8: Sustitucion de Poyeton: se hara un nuevo poyeton dentro de la cocina porque el que existe no esta en buenas condiciones.

Foto :

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
